

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
جامعة أكادير

التقرير السنوي | 2018

لتقدم تنفيذ برنامج عمل جامعة أكادير 2017-2022



www.agadir.ma

قائمة المحتويات

05 كلمة السيد رئيس المجلس الجماعي

الفصل الأول : الإطار المرجعي و المنهجي للتقرير

09 01. الإطار المرجعي

10 02. منهجية تتبع مشاريع برنامج عمل الجماعة

الفصل الثاني : تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

21 01. تقدم إنجاز المشاريع الذاتية

69 02. المشاريع بشراكة

77 03. مشاريع خارج برنامج عمل الجماعة

الفصل الثالث : الإمكانيات المالية المرصودة والإكراهات والحلول

87 01. الإمكانيات المالية المرصودة لبرنامج العمل الجماعي

103 02. مشاريع ذات إكراهات والحلول المقترحة

105 خلاصة التقرير

ملاحق : توظيفين و صور بعض المشاريع

109 01. المشاريع الموهّنة بمنطقة أكادير المركز

111 02. المشاريع الموهّنة بمنطقة أنزا

113 03. المشاريع الموهّنة بمنطقة تيكوين

115 04. المشاريع الموهّنة بمنطقة أكادير المحيط وبنسركاو

117 05. صور بعض المشاريع

ذ. صالح المالوكي
رئيس المجلس الجماعي لأكادير



بسم الله الرحمن الرحيم

ب

لاتفتأ مدينة أكادير تعزز مكانتها كحاضرة تنموية وعاصمة إدارية واقتصادية وقطب لجهة سوس ماسة و أكادير الكبير ومجال وصل والتقاء بين الشمال والجنوب. مدينة ذات إشعاع عالمي رمز للتعايش و الانفتاح يزداد طموح أبنائها في غد أفضل يعزز جودة الحياة بها ويعزز مكانتها الحضارية والاقتصادية، وهذا ما نعمل على تجسيده بالاستجابة له بكل جهد وتضحية مع كافة الشركاء المحيين لمدينتهم ...

وبمناسبة تقديم التقرير السنوي لتقدم تنفيذ برنامج العمل الجماعي برسم سنة 2018 لا يسعني باسمي وباسم أعضاء المجلس الجماعي لأكادير إلا أن أشكر وأحيي مجددا كل المنتخبين وأطر الجماعة على الجهود الحثيثة التي يبذلونها سواء في التدقيق المستمر للمشاريع والاجتهاد في بلورة الصيغ المالية وتجاوز الاكراهات وخصوصا في مجال تعبئة العقار وهي فرصة كذلك لتقديم الشكر للسلطات المحلية والمصالح الخارجية الذين عبؤوا جهودهم وامكانياتهم لربح تحدي التنمية والاسهام في تنزيل مضامين هذا البرنامج.

تنفيذ برنامج عمل الجماعة هذه السنة ساير نفس المنهجية والمراحل الأساسية لإنجاز المشاريع والمتمثلة في متابعة تسوية العقار والدراسات وتعبئة التمويل لكن، و الحمد لله، كان لمرحلة الانجاز الميداني حضور وازن هذه السنة حيث عرفت إخراج مجموعة من المشاريع إلى حيز الوجود.

مسجلين مرة أخرى أنه وإلى حد الان لم تستفد مدينة أكادير مما استفادت منه مدن أخرى من دعم الدولة والشراكة مع القطاعات الوزارية، وهو ما يجعل المقارنة مع بعض المدن التي أعيد تأهيلها من طرف الدولة مقارنة مغلوطة موضوعيا.

كلنا إرادة وعزم على تنفيذ التزاماتنا والرقى بمدينتنا كيفما كان حجم العقبات والاكراهات متفهمين الاستعجال الذي يبديه المواطنين والمواطنون للإسراع بإخراج العديد من البرامج التنموية وهو ما نجدد تأكيدنا على بحث كل المسارات الممكنة لتلبية انتظارات ساكنة عاصمة سوس العالمية.

كما أنتهز هذه المناسبة وكل المواطنين والمواطنات بمدينة الانبعاث لتجديد أمننا وتطلعنا لزيارة ميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لتشمل هذه المدينة مجددا برعايتكم المولوية السامية وتنال حقها مما تستحقه من الدعم المركزي.

“



الفصل الأول :

الإطار المرجعي و المنهجي للتقرير

الإطار المرجعي 1

يعتبر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 برنامج عمل الجماعة آلية لتسهيل الدور التنموي الذي تضطلع به الجماعات، كما تعتبره المادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 من رمضان 1437 الموافق ل 29 يونيو 2016 الوثيقة المرجعية الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة لتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.

وتبعا للمادة السادسة من نفس المرسوم، عمدت الجماعة الى ترتيب الأولويات وفق مضمون المرحلة (ب) التي تشير إلى وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب و انسجاما مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة او الاقليم متى توفرت.

كما تشير المادة نفسها في المرحلة (ج) الى تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة مع الاخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها. انطلاقا من ذلك فقد عمد المجلس الجماعي لأكادير خلال سنة 2018 الى مواصلة تنزيل البرنامج حسب الإمكانيات المتوفرة والتي تم تعبئتها محافظا على التوازنات المالية ومراعي الأولويات التي سطرها. فركز على تأهيل البنى التحتية وفق منظور الجودة والاستدامة المناسبين لمدينة اكادير كقطب جهوي يقود قاطرة التنمية والدفع بها نحو الأفضل.

إن تنزيل برنامج عمل الجماعة يعرف تحديات تهم بالخصوص تعقد وبطء المساطر ومحدودية الموارد وتراجع بعض الشركاء عن التزاماتهم، مما يدفع الجماعة الى إعادة النظر في ترتيب الأولويات وفق ماتقتضيه ظرفية دون الاخلال بالالتزامات. وجدير بالذكر أن تنفيذ برنامج عمل الجماعة يخضع لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي تنص على: «تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183، حيث يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف».

وعليه تم إعداد الميزانية السنوية لسنة 2018 وفق المرسوم رقم 2.16.307 الصادر في 23 رمضان 1437 الموافق ل 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات اعدادها، كما تم تنزيلها اخذا بعين الاعتبار تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية.

2 منهجية تتبع مشاريع برنامج عمل الجماعة

تنفيذا لأحكام المادتين 78 و94 من القانون التنظيمي 113.14 وتنزيلا للمادتين 13 و14 من مرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج الجماعة وتبعية وتعيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده، فإن رئيس المجلس الجماعي يتولى تنفيذ برنامج عمل الجماعة. كما يقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة. وبناء عليه تم الاعتماد على منظومة تتبع وتقييم المشاريع لإنجاز التقرير السنوي.

يشمل التقرير السنوي وفق المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه:

- نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج
- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.

بالإضافة الى هذه المحاور هناك بيانات حول المشاريع المنجزة خارج برنامج العمل التي أدرجت للضرورة او في إطار التزامات سابقة. كما يتضمن التقرير خرائط تحيل الى مواقع التوطين وتهيئة البنى التحتية.

بيانات منظومة تتبع المشاريع والبرامج

يقدم هذا التقرير جردا مفصلا للعمليات والمشاريع والبرامج التي اعتمدها برنامج عمل الجماعة والمنجزة خلال سنتي 2017 و2018، مصحوبة بمؤشرات نسبة الانجاز التراكمية، وهي مؤشرات تخص الفعالية كما أشار إليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم السالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الفعالية يحيل اصطلاحا إلى تحقيق الأهداف حيث تتم عملية المقارنة بين الأهداف المحددة في البداية والنتائج المحصل عليها. إنه قياس الفارق وإمكانية تحليله بين ما يزمع تنفيذه خلال السنة وما نفذ فعليا مما يسهل عملية تحليل الفارق ودراسته.

وبناء عليه تم الاعتماد على هذه المؤشرات لقياس سير مساطر تنفيذ المشاريع باعتبار أن سنتي 2017 و 2018 هما السنة الأولى والثانية لتنزيل المشاريع. ولا يمكن قياس النتائج من حيث وقعها وآثارها إلا بعد تنزيلها بفترة معينة.

هذا، ويمر مسلسل الإنجاز أساسا عبر ثلاث مراحل:

1. تسوية وضعية العقار.

2. الدراسات التقنية.

3. الأشغال.

وهي مراحل لا غنى عنها إلا في حالات امتلاك الجماعة للعقار أو دراسات أو إمكانية القيام بالأشغال ذاتيا. وفي هذا الصدد وجب التذكير أنه بسبب كثرة المنازعات العقارية المسجلة ضد الجماعة سابقا فقد وضع ضمن أولويات برنامج عمل الجماعة تسوية وضعية العقار.

وعليه فقد اعتمد في جدول التنقيط نسبة مئوية لتسوية وضعية العقار من خلال تبني تنقيط 5% لكل حلقة من حلقات سلسلة التسوية. ويمثل مجموع الحلقات 20% من مسلسل (Processus) المشروع في حالة المشاريع المرتبطة بالعقار. فيما تستأثر الدراسات التقنية بـ 40% والأشغال بنفس النسبة (40%) كما هو مبين في منظومة التنقيط أسفله. أما بخصوص تقييم الفعالية، فيتم من خلال احتساب النسبة التراكمية المحققة مقارنة مع الباقي إنجازها من المشروع.

منظومة التنقيط

تهدف هذه المنظومة إلى توضيح النسب المئوية المخصصة لمختلف العمليات الهادفة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج الذاتية. وسيتم اعتماد ست منظومات حسب نوعية العمليات المزمع إنجازها وهي كالتالي:

1. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية إعداد الدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطوبوغرافي
10%	5%	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
15%	5%	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
20%	5%	التعاقد على تعبئة العقار
25%	5%	البطاقة التقنية الأولية
30%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
35%	5%	المذكرة التقنية
40%	5%	التشخيص التقني
50%	10%	الدراسات جارية
60%	10%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100%	40%	إنجاز الأشغال

2. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار والقيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	تحديد التخصيص العمراني للعقار وإنجاز المسح الطوبوغرافي
10%	5%	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
15%	5%	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
20%	5%	التعاقد على تعبئة العقار
25%	5%	البطاقة التقنية الأولية
30%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
35%	5%	المذكرة التقنية
40%	5%	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات
50%	10%	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات
60%	10%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال
100%	40%	إنجاز الأشغال

3. منظومة التقييم الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار وتستوجب القيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5 %	5 %	البطاقة التقنية الأولية
10 %	5 %	البطاقة التقنية المفصلة
15 %	5 %	المذكرة التقنية
20 %	5 %	التشخيص التقني
30 %	10 %	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات
40 %	10 %	إسناد الصفحة المتعلقة بالدراسات
60 %	20 %	إتمام الدراسات وإعداد ملف طلب العروض المتعلقة بالأشغال
100 %	40 %	إنجاز الأشغال

4. منظومة التقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار والقيام بالدراسات من طرف المصالح الجماعية

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5 %	5 %	البطاقة التقنية الأولية
10 %	5 %	البطاقة التقنية المفصلة
15 %	5 %	المذكرة التقنية
20 %	5 %	التشخيص التقني
30 %	10 %	في طور الدراسات
40 %	10 %	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100 %	60 %	إنجاز الأشغال

5. منظومة التنقيط الخاصة بالدراسات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5 %	5 %	البطاقة التقنية
20 %	15 %	المذكرة التقنية
40 %	20 %	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات
100 %	60 %	إنجاز الدراسات

6. منظومة التنقيط الخاصة بالمقتنيات

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5 %	5 %	البطاقة التقنية
20 %	15 %	المذكرة التقنية
40 %	20 %	إعداد ملف العرض العمومي للمقتنيات
100 %	60 %	إستلام المقتنيات

تحديد المفاهيم التقنية الواردة في منظومة التنقيط

3. المذكرة التقنية

- بالإضافة إلى ماسبق ذكره تتضمن المذكرة التقنية مايلي:
- كيفية إنجاز المشروع مع الجدول الزمني.
 - مذكرة حول المواد والعتاد لإنجاز المشروع.
 - مذكرة حول برمجة الميزانية.

4. التشخيص التقني

- زيارة ميدانية وتقييم الإكراهات والمخاطر وكذلك حالة تدهور وتقدم المعدات.

5. المؤشر

- أداة للتقييم والتقرير يمكن من قياس الوضعية الراهنة لسيرورة المشروع بشكل موضوعي.

5. الإكراه

- كل ما يحول دون إنجاز المشروع سواء كان داخليا أو خارجيا ويدرج ضمن المخاطر التي تم اتخاذها بعين الاعتبار خلال بلورة برنامج عمل الجماعة، مع احتمال تجاوزه.

1. البطاقة التقنية الأولية

- اسم المشروع.
- صاحب المشروع.
- الحي المستهدف.
- موقع المشروع مدعم بالصورة.
- التكلفة المتوقعة للمشروع.
- مصادر التمويل.
- لوحة مؤشرات الفعالية.
- الأهداف وطبيعة الأنشطة.

2. البطاقة التقنية المفصلة

- بالإضافة إلى ماسبق ذكره تشمل البطاقة التقنية المفصلة ما يلي:
- مساحة العقار المخصصة للمشروع.
 - معلومات حول العقار من خلال تصميم التجزئة أو التهيئة.
 - برنامج الاستشارة المعمارية ومهام مكاتب الدراسات التقنية.

الفصل الثاني :

تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

1 تقدم المشاريع الذاتية إنجاز



يضم هذا الجزء جدول تتبع الإجراءات الخاصة بكل مشروع وارد ضمن المشاريع ذات التمويل الذاتي من طرف الجماعة مع التركيز على تدقيق منظومة التتبع و تحديد النسب الضرورية لتقييم فعالية الإنجاز.



نسب إنجاز المشاريع الممولة ذاتياً

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
1	1.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز بنايات الإدارة	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	36 %	الأشغال جارية في ملحقات أنزا- بنسركاو- تيكوين	50 %	50 %
2	1.2	أكادير	تجهيز المكتب الصحي الجماعي	إعداد ملف العرض العمومي للمقننات	40 %	<ul style="list-style-type: none"> الشطر 1 : صفقات التجهيز (المختبر+ مستودع الأموات) في طور المصادقة الشطر 2 : الدراسة جارية 	50 %	50 %
3	1.3	أكادير	تهيئة المقرات الإدارية: <ul style="list-style-type: none"> المحطة الطرقية مقر الجماعة الملحقات الجماعية. 	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الأشغال	40 %	<p>المحطة الطرقية: تم تعيين المهندس المعماري: نهاية الأشغال الخاصة بإحداث مكتب الحالة المدنية.</p> <p>القصر البلدي: نهاية الأشغال جناح الاستقبالات. إعداد برنامج الاستشارة بالنسبة لباقي البناية.</p> <p>الملحقات الجماعية: في طور إتمام التصميم المعماري للبناية الكائنة بالشيخ السعدي جناح القسم المالي. في طور إعداد الاستشارة المعمارية بخصوص المقاطعة 1 و 2 .</p> <p>أدمج مكتب الحالة المدنية حي الخيام في مشروع 3.9.</p>	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
4	1.4	أكادير تجزئة الهدى	إحداث مكتب الحالة المدنية	إنجاز المشروع	100 %	أنجزت الدراسات المعمارية	50 %	50 %
5	1.5	أكادير رياض السلام	إحداث مكتب الحالة المدنية	إنجاز المشروع	100 %	أنجزت الدراسات المعمارية	50 %	50 %
6	1.6	أنزا العليا بلوك ب تدارت	إحداث مكتب الحالة المدنية	إكراه عقاري: تم نقل المشروع الى 1.3				
7	1.7	مشاريع أفقية	اقتناء الأراضي، احتلال الملك الغابوي، نزع الملكية	مسطرة تسوية الوضعية العقارية جارية	40 %	التسوية العقارية جارية	40 %	60 %
8	1.8	مشاريع أفقية	اقتناء الشاحنات والآليات	اقتناء السيارات والشاحنات	30 %	تم صرف 30% من الميزانية المرصودة.	30 %	70 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المتحققة	نسبة الباقي إنجازها
9	1.9	أكادير شارع مولاي عبد الله	إتمام أشغال وتجهيز المركب الإداري والثقافي	إعداد المذكرة التقنية للمشروع	100 %	تم نقله الى مشاريع بشراكة (دار الفنون)		
10	1.10	أكادير تمديد الداخلة، محور شمال جنوب	إحداث مركز إداري	إكراه عقاري				
11	1.11	أنزا	تأهيل المستودع الجماعي	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال	60 %	في طور إنجاز البرنامج	20 %	80 %
12	1.12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور إتمام البرنامج المعماري	10 %	90 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
13	1.13	أكادير شارع محمد الشيخ السعدي	إتمام أشغال وتجهيز المكتب الصحي الجماعي	إسناد الصفحة المتعلقة بالدراسات	45 %	الأشغال جارية	80 %	20 %
14	2.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنائات الاجتماعية	إعداد المذكرة التقنية للمشروع	30 %	<ul style="list-style-type: none"> الصيانة: رست صفة الشطر الأول اما بالنسبة للشطر الثاني فهو في طور إعداد طلب العروض الخاص به. التجهيز: تم تنفيذ صفحتي التجهيز 2017 و 2018. 	60 %	40 %
15	2.2	أكادير حي الوداديات	تأهيل فضاء المتقاعدين	انتهاء الأشغال	-	تم تأهيله	100 %	أنجز
16	2.3	أنزا الحسنية	إحداث فضاء المتقاعدين	البطاقة التقنية الأولية	25 %	<ul style="list-style-type: none"> في طور التسوية العقارية. تم إعداد البطاقة التقنية المفصلة. 	25 %	75 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
17	2.4	أنزاجي تدارت بلوك د	إحداث فضاء المتقاعدين	البطاقة التقنية الأولية	% 25	تم تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60
18	2.5	أكاديرحي الوداديات	تهيئة المركب الإداري والاجتماعي	تعيين المهندس المعماري	% 40	تم تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60
19	2.6	أكاديرحي أمسرنات	إعادة بناء فضاء للأنشطة الاجتماعية (الخزانة العالية)	تعيين المهندس المعماري	% 40	تم تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60
20	2.7	بنسركا وحي الوفاق بالقرب من الملعب الرياضي	إحداث فضاء الأنشطة الاجتماعية	إكراه عقاري				

الرقم	الرمز	التوظيف	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
21	2.8	مشاريع أفقية	صيانة المؤسسات التعليمية	إعداد المذكرة التقنية للمشروع	% 35	الصفحة الأولى في طور التنفيذ والثانية في طور الإعلان	% 60	% 40
22	2.9	أكادير أدرار	تجهيز حضانة دار السعادة	اقتناء الأجهزة	% 100	تم اقتناء الأجهزة	% 60	% 40
23	2.10	أكادير رياض السلام	إحداث فضاء الاستجمام (وحدتين)	تعيين المهندس المعماري	% 40	إكراه عقاري		
24	2.11	أكادير شارع الحسن الأول الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	تعيين المهندس المعماري	% 40	إكراه عقاري		

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
25	2.12	أكادير شارع 11 يناير الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	إكراه عقاري		
26	2.13	أكادير حي المسيرة	إحداث فضاء المتقاعدين	إعداد الملفات المتعلقة	% 40	تم تعيين المهندس المعماري	% 50	% 50
27	2.14	بنسركاو منطقة ابن خلدون	إحداث فضاء المتقاعدين	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة : الوطنية للتنمية البشرية				
28	2.15	تيكوبين بالقرب من مسجد أساكا	إحداث فضاء المتقاعدين	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	تم تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60
29	2.16	أكادير أدرار	تجهيز المركب الثقافي	اقتناء الأجهزة	% 100	-	-	-

الرقم	الرمز	التوظيف	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
30	2.17	أكادير رياض السلام	إحداث نادي نسوي ودار الشباب	الإعلان عن الصفقة	% 60	تمت الدراسة المعمارية والاستجابة لملاحظات لجنة التعمير .	% 50	% 50
31	2.18	تيكويين دار الطلبة	تهيئة المركب السوسيوثقافي	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
32	2.19	تيكويين حي الزيتون	توسيع الحضانة	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 60	تم إعلان الصفقة دون تقديم عروض لمرتين .	% 60	% 40
33	2.20	أكادير مقابر إحشاش القديم، النجاح والحي المحمدي	تهيئة المقابر	التشخيص التقني	% 20	رست صفقة الأشغال	% 40	% 60

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المتوقعة	نسبة الباقي إنجازها
34	2.21	تيكويرن مقابر تيليلار، أيت القاضي و إيمونسيس	تهيئة المقابر	التشخيص التقني	20 %	رست صفقة الأشغال	40 %	60 %
35	2.22	أنزا تدارت	تهيئة المقبرة	التشخيص التقني	20 %	رست صفقة الأشغال	40 %	60 %
36	2.23	بنسركاو	تهيئة المقبرة	التشخيص التقني	20 %	رست صفقة الأشغال	40 %	60 %
37	232	أنزا حديقة الأمل	فضاء المتقاعدين	نقل من المشاريع بشراكة	-	تم تعيين المهندس المعماري	40 %	60 %
38	3.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنائيات الثقافية	إعداد الورقة التقنية المفصلة للمشروع	20 %	<ul style="list-style-type: none"> الصيانة: أنجز التشخيص وسيعلن عن الصفقة شرع في تسليم تجهيزات المركب الثقافي الحاج الحبيب 	60 %	40 %

الرقم	الرمز	التوظيف	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
39	3.2	بنسركاو أغروض بالقرب من المركز ا لسوسيو ثقافي	إحداث دار الحي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60
40	3.3	أكادير زنقة التعاون تبرزت	تهيئة ساحة ذاكرة أكادير	إعداد الملفات المتعلقة بإنجاز الدراسات	% 40	اقتراح دراسة جيوتقنية	% 0	% 100
41	3.4	أكادير مركب محمد جمال الدراة	تهيئة قاعة الأنشطة الثقافية	تعيين المهندس المعماري	% 45	تم الإعلان عن صفقة الاستشارة المعمارية	% 30	% 70
42	3.5	أكادير رياض السلام	إحداث قاعة متعددة الاستعمالات الثقافية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	أنجزت الدراسات والاستشارة المعمارية	% 60	% 40
43	3.6	أكادير المقر القديم لبنك المغرب	تهيئة متحف الذاكرة	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
44	3.7	بنسركا وحي الوفاق	إحداث مركب ثقافي	الأشغال جارية	75 %	الأشغال جارية	75 %	25 %
45	3.8	أكادير شارع علال الفاسي الخيام	إحداث الفضاء الثقافي	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	تم تعيين مكتب الدراسات	50 %	50 %
46	3.9	أكادير حي الخيام (مكتب الحالة المدنية الحالي) +1.3	تهيئة المركب الثقافي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	تم تعيين مكتب المهندسين المعماريين	50 %	50 %
47	3.10	تكوين المركز الثقافي الحالي	تهيئة المركز الثقافي	تم الاعلان عن صفقة الاستشارة المعمارية	40 %	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	30 %	70 %
48	3.11	أكادير مسرح الهواء الطلق	صيانة مسرح الهواء الطلق	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور إتمام برنامج الاستشارة المعمارية	30 %	70 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقع إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
49	3.12	أكادير تمديد الدائرة قرب ثانوية شوقي	إحداث دار الحي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	48 %	إكراه عقاري		
50	3.13	أنزا الحسنية	إحداث دار الحي	إعداد البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> في طور التسوية العقارية تم إعداد البطاقة التقنية المفصلة 	25 %	75 %
51	4.1	مشاريع أفقية	صيانة وصيانة التجهيزات الرياضية وفضاءات الاستجمام	إعداد الورقة التقنية للمشروع	25 %	تم تنفيذ الصفقة الأولى والثانية في طور المصادقة	60 %	40 %
52	4.2	أنزا الحسنية	إحداث فضاء رياضي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور التسوية العقارية تم إعداد البطاقة التقنية المفصلة	25 %	75 %
53	4.3	بنسر كاو بجانب الطريق الوطنية	إحداث فضاء ترفيهي + 4.18	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	تمت الدراسات المعمارية	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
54	4.4	بنسركاو منطقة ابن خلدون	إحداث فضاء ترفيهي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	تمت صفة الدراسات	% 40	% 60
55	4.5	بنسركاو فونتي العليا	إحداث فضاء رياضي	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	تمت صفة الدراسات	% 40	% 60
56	4.6	تيكويين لاريب الحاجب	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إكراه عقاري				
57	4.7	تيكويين الزيتون الشطر الثاني	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	إتوقفت الأشغال (في انتظار التوقيع على ملحق الاتفاقية مع المياه والغابات)	% 60	% 40
58	4.8	تيكويين حي أساكا تاسيلا	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إعداد البطاقة التقنية المفصلة	% 30	المشروع مرتبط بمشروع الحافلة ذات الجودة العالية		
59	4.9	تيكويين أبت القاضي	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إكراه عقاري				

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها	
60	4.10	تيكوبين تنمة فضاء أساكا	إتمام أشغال فضاء رياضي وترفيهي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	رست صفقة أشغال الصيانة الخاصة بالملاعب الرياضية بالنسبة للشطر الاول	% 60	% 40	
61	4.11	أكادير، أنزا، بنسركا و تيكوبين	تهيئة فضاء رياضات التزلق والكرة الحديدية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	في طور تحديد البرنامج	% 30	% 70	
62	4.12	أكادير دار الشباب الحي الحسني	إحداث قاعة المغطاة	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة					
63	4.13	بنسركا و الملعب الرياضي الوفاق	إحداث قاعة مغطاة	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	% 50	<ul style="list-style-type: none"> الأشغال جارية رست صفقة انتهاء الأشغال 	% 60	% 40	
64	4.14	تيكوبين ملعب مداني تيكوبين	إحداث قاعة مغطاة	تسوية الوضعية العقارية	% 30	تم تعيين المهندس المعماري	% 40	% 60	
65	4.15	أكادير	صيانة مركب الانبعاث (دراسة)	الأشغال جارية	% 75	في طور تحديد البرنامج	% 30	% 70	

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المتبقية
66	4.16	أكادير الحي المحمدي	إحداث مسبح	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	إكراه جيوتقني	
67	4.17	بنسركاو بالملعب الرياضي الوفاق	إحداث مسبح	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	تم تعيين المهندس المعماري	50 %
68	4.18	بنسركاو أغروض على مستوى الطريق الوطنية رقم 10	إحداث مسبح	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	تم إدماجه في المشروع 4.3	
69	4.19	أكادير سيدي يوسف، ابن زيدون العلوي والسفلي، تلمبرجت الرياضية	تعشيب الملاعب الرياضية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيدي يوسف : الأشغال على وشك الانتهاء بالملعب. ▪ ابن زيدون العلوي: الأشغال جارية. ▪ ابن زيدون السفلي: وتالبرجت الدراسات جارية. 	45 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
70	4.20	أنزا المركب الرياضي أنزا المركز	إحداث القاعدة المغطاة	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	تمت الدراسة المعمارية	% 60	% 40
71	4.21	أنزا العليا تدارت	إحداث القاعدة المغطاة	البطاقة التقنية المفصلة *	% 30	في طور إعداد الاستشارة المعمارية	% 30	% 70
72	4.22	أكادير الانبعاث	إحداث المسبح الاولمبي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات *	% 40	<ul style="list-style-type: none"> تم إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات. ملحق الاستجابة للمعايير الدولية للمسابح الأولمبية في طور إعداد. 	% 40	% 60
73	4.23	أنزا المركب الرياضي	تهيئة الملعب الرياضي	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	الاستشارة المعمارية في طور الإعداد	% 40	% 60
74	4.24	أكادير المحمدي	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	رست صفقة الدراسات الخاصة بالمساحات الخضراء وتم تحويل المشروع الى الفضاء المحاذي للطريق الوطنية رقم 8.	% 40	% 60

* المشاريع ذات الوضعية العقارية في طور التسوية

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
75	4.25	أكادير تمديد الداخلة	إحداث فضاء ترفيهي	إكراه عقاري				
76	4.26	أنزا العليا بلوك أ تدارت	إحداث فضاء رياضي	إنجزت الدراسة المعمارية	50 %	أنجزت الدراسة المعمارية	50 %	50 %
77	5.1	أنزا الحسنية	إحداث السوق الأسبوعي*	تم إعداد البطاقة التقنية المفصلة	50 %	تم إعداد البطاقة التقنية المفصلة	25 %	75 %
78	5.2	أكادير	إعادة تهيئة السوق البلدي	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	في طور الإعلان عن صفقة الدراسات	35 %	65 %
79	5.3	أكادير	ربط سوق الأحد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي ومياه إطفاء الحرائق والكهرباء والإنارة	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				

* المشاريع ذات الوضعية العقارية في طور التسوية

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
80	5.4	أنزا جي تدارت بلوك د	إحداث سوق بتدارت	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات*	% 50	في طور إعداد الاستشارة المعمارية	% 35	% 65
81	5.5	أنزا جي تدارت بلوك ب	إحداث سوق بتدارت	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات*	% 50	في طور إعداد الاستشارة المعمارية	% 35	% 65
82	5.6	أكادير	إعادة تهيئة سوق تلبرجت	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	% 50	في طور الإعلان عن صفقة الدراسات	% 40	% 60
83	5.7	تيكويين	تهيئة سوق تيكويين ومحيطه	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات*	% 40	في طور إعداد الاستشارة المعمارية	% 35	% 65
84	6.1	مشاريع أفقية	فصل شبكة الإنارة العمومية عن شبكة المكتب الوطني للكهرباء	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	أنجز الشق الأول من الأشغال على مستوى دوار الصويري والحسنية	% 50	% 50

* المشاريع ذات الوضعية العقارية في طور التسوية

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
85	6.2	مشاريع أفقية	دراسة مطابقة شبكتي الكهرباء (الضغط المتوسط والعالي) للمعايير التقنية وإنجاز الشطر الأول من الأشغال	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات	% 45	الأشغال جارية بالموازاة مع إنجاز أشغال الطرق 1 و 2.	% 75	% 25
86	6.3	مشاريع أفقية	دراسة لتحويل الأعمدة الكهربائية المعيقة للمرور وإنجاز الشطر الأول من الأشغال	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات	% 45	في طور الدراسة	% 50	% 50
87	6.4	مشاريع أفقية	دراسة لتغيير الأسلاك الكهربائية العارضة بأسلاك مؤمنة وإنجاز الشطر الأول من الأشغال	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات	% 40	الأشغال جارية بالموازاة مع إنجاز أشغال الطرق 1 و 2 .	% 50	% 50
88	6.5	مشاريع أفقية	إحداث مراكز التحويل	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات	% 40	رست الصفحة بخصوص إحداث 3 محطات للتحويل الكهربائي.	% 60	% 40

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
89	6.6	مشاريع أفقية	تقوية شبكات الضغط المنخفض	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	الدراسات جارية مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء.	50 %	50 %
90	6.7	أنزا الحسنية	أشغال الإنارة والكهربة	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	45 %	في طور انتهاء الأشغال	80 %	20 %
91	6.8	أنزا تدارت الهاروشي	أشغال الإنارة والكهربة	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	الأشغال منتهية	100 %	-
92	6.9	أنزا الحي الصناعي	أشغال الإنارة والكهربة	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
93	6.10	أنزا العليا	أشغال الإنارة والكهربة	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
94	6.11	أنزا المركز	أشغال الإنارة والكهربة	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
95	6.12	أكادير شوارع محمد الفاسي، 11 يناير، الحسن الأول، عبد الله الكرسيفي، النهضة، تمديد محور شمال جنوب	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
96	6.13	أكادير أحياء السلام، الشرف، الشريط السياحي، الوداديات، البحارة، الانبعاث، الداخلة، القدس، أيت تاووكت، أيت المودن، إيمونسيس، أحلاكا، إليغ، الإقامة، تلبرجت، الوفاء، المختار السوسي، الفضية، تمديد الداخلة، المسيرة، رياض السلام، سيدي يوسف، العزيز، الخيام 1 و 2، يواركان، النجاح، النهضة، تمديد X، الحي الإداري، محيط المحطة الطرفية والسوق المغطى وقرية الأطفال والعمارة A، الحي الصناعي والقصبية	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> الأشغال منتهية على مستوى مداخل المنطقة السياحية. الأشغال جارية بالمنطقة الإدارية، محيط المحطة الطرفية والسوق البلدي. 	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
97	6.14	بنسركاو المركز	أشغال الإنارة العمومية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
98	6.15	بنسركاو أغروض	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
99	6.16	بنسركاو بوتاسرا	أشغال الإنارة العمومية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور انتهاء الأشغال	80 %	20 %
100	6.17	بنسركاو الحامية العسكرية للجنوب ووزق	أشغال الإنارة العمومية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
101	6.18	بنسركاو حي الفرح	أشغال الإنارة العمومية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	في طور الدراسة	40 %	60 %
102	6.19	بنسركاو فونتي، فونتي العليا و بو حسين	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	40 %	60 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
103	6.20	بنسركاو شارع أسا	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30%	في طور الدراسة	40%	60%
104	6.21	بنسركاو مدخل الطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه ابن خلدون	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30%	في طور الدراسة	40%	60%
105	6.22	تيكويين تيليللا	أشغال الإنارة العمومية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40%	تم إنجاز الجزء الأول من الأشغال	60%	40%
106	6.23	تيكويين دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية	الدراسات جارية	50%	في طور انتهاء الأشغال	80%	20%
107	6.24	تيكويين شارع تودرت	أشغال الإنارة العمومية	انتهاء الأشغال	100%	في طور انتهاء الأشغال	80%	20%
108	6.25	تيكويين الطريق الرابط بين أساكا وتاسيلا	أشغال الإنارة العمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30%	في طور الدراسة	40%	60%

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
109	6.26	تيكويين الطريق الرابط بين تيكويين والدشيرة عبر دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الأشغال	% 75	في طور انتهاء الأشغال	% 80	% 20
110	6.27	تيكويين زنقة الوصال	أشغال الإنارة العمومية	أشغال في طور الإنجاز	% 75	في طور انتهاء الأشغال	% 80	% 20
111	6.28	مشاريع أفقية	تأهيل إنارة الملاعب الرياضية	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز الجزء الأول من الأشغال بفضاءات الاستجمام بكل من ابن زيدون و المسيرة. (في طور إتمام صفقة إعادة تأهيل الإنارة العمومية بالفضاءات التالية: التضامن السلام- الهدى- أمزيل بنسركاو- ملعب كرة السلة بالحي السويسري-أساكا تيكويين- - بوكري أغروض-أركاننا السلام). 	% 80	% 20

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
112	6.29	مشاريع أفقية	إضاءة واجهات البنائيات والمآثر	الدراسات جارية	% 50	الدراسات جارية في إطار التصميم المديري للتهيئة الكهربائية.	% 50	% 50
113	6.30	مشاريع أفقية	وضع نظام التدبير عن بعد للإنارة العمومية في بعض المناطق	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	الدراسات جارية في إطار التصميم المديري للتهيئة الكهربائية.	% 40	% 60
114	6.31	مشاريع أفقية	استعمال الطاقات المتجددة لتزويد البنائيات الجماعية ومحطات الضخ	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	في طور الدراسة	% 40	% 60
115	6.32	مشاريع أفقية	تقوية الإنارة العمومية في ممرات الراجلين	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	رست الصفحة بالنسبة للمنطقة التي تجري بها أشغال تهيئة الطرق (2 و1)	% 50	% 50
116	6.33	مشاريع أفقية	إحداث ورشة للتكوين في مجال تقنيات الإنارة العمومية والنجاعة الطاقية	إعداد الملفات المتعلقة بصفحات إنجاز الأشغال	% 75	في طور إتمام صفة الأشغال	% 85	% 15

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها	
117	6.34	أكادير	إضاءة الشاطئ بمصايح اقتصادية	الدراسات جارية	50 %	رست صفقة إنجاز أشغال الشطر الأول	85 %	15 %	
118	7.1	مشاريع أفقية	إفحص احترام مقتضيات عقد التدبير المفوض الحالي للمطرح العمومي	إتمام الافتحاص التقني والمالي	100 %	<ul style="list-style-type: none"> تم الافتحاص التقني والمالي بصدد إعداد محضر برتوكول الاتفاق 	100 %	-	
119	7.2	مشاريع أفقية	إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بتجديد عقد تدبير المطرح العمومي	تم اسناد تدبير مرفق المطرح العمومي لمؤسسة التعاون لجماعات أكادير الكبرى					
120	7.3	مشاريع أفقية	إعداد نماذج موحدة للوثائق الإدارية والتجهيزات الجماعية	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية والتجهيزات الجماعية	60 %	في طور الدراسة	40 %	60 %	

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
121	7.4	مشاريع أفقية	إحداث ساحات عمومية ومحطات استبدال وسائل النقل العمومي	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	في طور الدراسة	50 %	50 %
122	7.5	أكادير أحياء إحشاش، الوداديات، العزيز، القصبة، تلزي، الحي الحسني، الحي المختلط، القدس، الكويرة، الخيام، ساطاس وتلبرجت	تأهيل أزقة الأحياء	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> الدراسة في طور الانجاز: تلزي، إحشاش، العزيز، الحي الحسني، تلبرجت، الخيام و ساطاس، الحي المختلط القصبة. حي القدس : إعلان عن صفقة الدراسات. حي الكويرة بشراكة مع العمران. 	50 %	50 %
123	7.6	أكادير سفوح الجبال	تهيئة الشبكة الطرقية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> الدراسة منجزة. إغيل او ضرور: صفقة الاشغال في طور المصادقة. 	60 %	40 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
124	7.7	أنزا المركز وتدارت	تأهيل أزقة الأحياء الأحياء	إتمام الدراسات	% 50	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
125	7.8	بنسر كاو منطقة بوتاسرا	تأهيل أزقة الأحياء	إتمام الدراسات	% 50	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
126	7.9	تيكويين المركز	تأهيل أزقة الأحياء	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	الدراسة في طور إعلان الصفقة	% 60	% 40
127	7.10	تيكويين الحاجب	تأهيل أزقة الأحياء	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	الدراسة في طور إعلان الصفقة	% 60	% 40
128	7.11	تيكويين الزيتون	تأهيل أزقة الأحياء	البطاقة التقنية المفصلة	% 30	الدراسة في طور إعلان الصفقة	% 60	% 40
129	7.12	تيكويين تيليللا	تأهيل أزقة الأحياء	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	% 40	الدراسة منجزة	% 60	% 40

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
130	7.13	مشاريع أفقية	تزويد المدينة بآثاث حضري عصري	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	تلبورت : الاشغال في طور الإنجاز.	60 %	40 %
131	7.14	مشاريع أفقية	تجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	الصفحة في طور الانجاز على المستوى المدينة	60 %	40 %
132	7.15	مشاريع أفقية	تحديث شبكة الإشارات الضوئية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشطر الأول: الصفحة منجزة. ▪ الشطر الثاني: الصفحة في طور الإعلان. 	60 %	40 %
133	7.16	أكادير تجزئة الهدى	إحداث ساحة عمومية	البطاقة التقنية المفصلة	30 %	رست صفحة الدراسات	40 %	60 %
134	7.17	أكادير الحي المحمدي	إحداث ساحة عمومية	إتمام الدراسات	50 %	رست صفحة الدراسات	40 %	60 %
135	7.18	بنسركاو ساحة عيساوة	إحداث ساحة عمومية	إكراه عقاري				

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
136	7.19	تيكويرين أساسيس	إحداث ساحة عمومية	إكراه عقاري				
137	7.20	أنزا الشاطئ	تهيئة الشاطئ	تسوية الوضعية العقارية	20 %	<ul style="list-style-type: none"> في انتظار التسوية حسب الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز مشروع اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك البحري في طور الإتمام انطلاق إعداد دراسة للشريط الساحلي في إطار التعاون الدولي 	10 %	90 %
138	7.21	أكادير طريق تيليلو الهبي المحمدي	إحداث محاور طرقية	إعداد دفتر التحملات المتعلقة بالدراسات	40 %	الدراسة في طور الانجاز	50 %	50 %
139	7.22	أكادير الطريق المداري الكبير	إحداث محاور طرقية	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
140	7.23	أكادير طرق تيليلو محيط غرفة التجارة	إحداث محاور طرقية	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	الدراسة منجزة	60 %	40 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
141	7.24	أكادير الحزام السياحي والشاطئي، إلبيغ، شارع الجيش الملكي	إحداث مرابد	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
142	7.25	أكادير محيط العمارات حي السلام	تهيئة الشبكة الطرقية		% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20
143	7.26	أكادير شارع الجيش الملكي	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	% 60	% 40
144	7.27	أكادير شارع 2 مارس	تهيئة الشوارع		% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20
145	7.28	أكادير شارع المقاومة	تهيئة الشوارع	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها	
146	7.29	أكادير شارع القاضي عياض	تهيئة الشوارع	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20	
147	7.30	أكادير شارع 18 نونبر			% 60	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	% 50	% 50	% 50
148	7.31	أكادير شارع الشيخ ماء العينين			% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20	% 20
149	7.32	أكادير زنقة 9 يوليوز			% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20	% 20
150	7.33	أكادير زنقة الحاج الحبيب			% 60	الأشغال في طور الانجاز	% 80	% 20	% 20
151	7.34	أكادير زنقة واد زيز			% 50	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	% 50	% 50	% 50

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
152	7.35	أكادير زنقة الرئيس البكاي	تهيئة الشوارع	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	الأشغال في طور الانجاز	80 %	20 %
153	7.36	أكادير شارع مولاي عبد الله	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	40 %	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	50 %	50 %
154	7.37	أكادير شارع عبد الرحيم بوعيد	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	40 %	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	50 %	50 %
155	7.38	أكادير شارع الإمام البخاري	تهيئة الشوارع	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	50 %	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	50 %	50 %
156	7.39	أكادير شارع المولى اسماعيل	تهيئة الشوارع	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	50 %	تم الإعلان عن صفقة الأشغال	50 %	50 %
157	7.40	أكادير زنقة وجدة	تهيئة الشوارع	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	50 %	الدراسة في طور الانجاز	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
158	7.41	أكادير شارع ولي العهد	تهيئة الشوارع	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الدراسة منجزة	% 60	% 40
159	7.42	أكادير زنقة أخنوش	تهيئة الشوارع	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 15	تم الإعلان عن صفقة الدراسات	% 50	% 50
160	7.43	أكادير زنقة المعرض	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	الدراسة منجزة	% 60	% 40
161	7.44	أكادير شارع 29 فبراير	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
162	7.45	أكادير شارع كينيدي	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
163	7.46	أكادير شارع محمد إقبال	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	الدراسة منجزة	% 55	% 45

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
164	7.47	أكادير شارع عمر الخيام	تهيئة الشوارع	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %
165	7.48	أكادير طرقات المخيم، تلبرجت والمرابيد	تهيئة الشوارع	إعداد الملفات المتعلقة بصفحات إنجاز الدراسات	40 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %
166	7.49	أنزا طريق الملاحة	تهيئة الشوارع	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %
167	7.50	أنزا شارع المحيط	تهيئة الشوارع	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %
168	7.51	بنسركاو العيون	تهيئة الشوارع	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي لإنجازه
169	7.52	تكوين الطريق المزدوج شرق غرب والطرق المداري تيللا أدرار	أشغال تمديد الطرق	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الصفحة منجزة	60 %	40 %
170	7.53	أكادير واد الحوار	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسة منجزة	55 %	45 %
171	7.55	أكادير واد تناوت	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	في طور إعداد صفحة الدراسات	40 %	60 %
172	7.56	أكادير قناطر على الطريق الوطنية رقم 1 ومحور شرق غرب	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	تم تعيين المهندس المعماري	40 %	60 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
173	7.57	تكوين واد أغزر العربا	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 50	الدراسة في طور الانجاز	% 50	% 50
174	7.58	أكادير ميناء الصيد البحري الحاجب	إحداث الخط الأول للرافات ذات الجودة العالية	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
175	7.59	تكوين منطقة أخليج	إحداث منتزه أخضر	تم نقله إلى لائحة المشاريع بشراكة				
176	7.60	مشاريع أفقية	إحداث فواحات لإطفاء الحرائق	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الصفقة في طور الاعلان	% 60	% 40
177	7.61	مشاريع أفقية	إحداث ممرات خاصة بالدراجات	إتمام الدراسات	% 50	تم تعيين مكتب الدراسات	% 50	% 50

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
178	7.62	مشاريع أفقية	إحداث ممرات خاصة بالراجلين	إتمام الدراسات	% 50	تم تعيين مكتب الدراسات	% 50	% 50
179	7.63	أكادير الطريق الوطنية رقم 1	المحور الطرقي شارع الجيش الملكي الميناء وبعض المدارات	إنهاء الأشغال	% 100	الدراسات في طور الانجاز	% 50	% 50
180	7.64	أنزا الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 15	في طور إعداد صفقة الدراسات	% 40	% 60
181	7.65	بنسركاو الطريق الوطنية رقم 10	تأهيل مدخل المدينة	إتمام الدراسات	% 50	الدراسات منجزة	% 60	% 40
182	7.66	تيكويين الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	% 40	الدراسات في طور الانجاز	% 50	% 50

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
183	7.67	تيكوين عبر الطريق السيار	تأهيل مدخل المدينة (دراسة)	إعداد الملفات المتعلقة بصفقات إنجاز الدراسات	100 %	الدراسات في طور الانجاز	50 %	50 %
184	8.1	أكادير	تهيئة المساحات الخضراء : 27 فضاء أخضر	المذكرة التقنية	15 %	13 فضاء أخضر	45 %	55 %
185	8.2	أنزا	تهيئة المساحات الخضراء : 8 فضاء أخضر	المذكرة التقنية	15 %	4 فضاء أخضر	45 %	55 %
186	8.3	بنسركاو	تهيئة المساحات الخضراء : 6 فضاء أخضر	المذكرة التقنية	15 %	4 فضاء أخضر	60 %	40 %
187	8.4	تيكوين	تهيئة المساحات الخضراء : 7 فضاء أخضر	المذكرة التقنية	15 %	4 فضاء أخضر	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
188	8.5	أكادير	حفر الآبار وتجهيزها	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسات جارية	50 %	50 %
189	8.6	أنزا	حفر الآبار وتجهيزها	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	15 %	الدراسات جارية	50 %	50 %
190	8.7	أكادير شارع محمد السادس	تأهيل الحدائق	المذكرة التقنية	15 %	الدراسات جارية	50 %	50 %
191	8.8	أكادير حديقة ابن زيدون	تأهيل الحدائق	إتمام الدراسات	50 %	إعلان عن صفحة الدراسات	40 %	60 %
192	8.9	أكادير حديقة محمد جمال الدرة	تأهيل الحدائق	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	60 %	الدراسات جارية	50 %	50 %

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
193	8.10	أكادير حديقة الشرف وتدارت	تأهيل الحدائق	إتمام الدراسات	% 50	الدراسات جارية	% 50	% 50
194	8.11	أكادير حديقة الهدى (فضاء المتقاعدين)	تأهيل الحدائق	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الدراسات جارية	% 50	% 50
195	8.12	أكادير الحديقة التذكارية	تأهيل الحدائق	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان طلب العروض المتعلقة بالأشغال	% 60	الدراسات جارية	% 50	% 50
196	8.13	أكادير الحديقة النباتية	تأهيل الحدائق	المصادقة على مقرر المجلس المتعلق بتصفية الوضعية العقارية		إكراه عقاري		
197	8.14	أنزا حديقة الأمل (الجزء العلوي)	تأهيل الحدائق	إنجاز الأشغال	% 100	الدراسات جارية	% 50	% 50

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المحققة	نسبة الباقي إنجازها
198	8.15	بنسركاو	حفر الآبار وتجهيزها	الأشغال جارية	% 60	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 60	% 40
199	8.16	تيكوين	حفر الآبار وتجهيزها	الأشغال جارية	% 60	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 60	% 40
200	8.17	أكادير	إحداث مستودع الخدمة بالفضاءات الخضراء	إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات	% 40	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 40	% 60
201	9.1	مشاريع أفقية	عصرنة البنية التحتية الالكترونية للجماعة	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 30	أنجزت دراسة داخلية	% 40	% 60
202	9.2	مشاريع أفقية	انجاز منظومة معلومة مائية مندمجة للتدبير	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 20	رست صفقتان	% 40	% 60
203	10.1	مشاريع أفقية	دراسة لإعداد مخطط حركة السير والتشوير	تحسين حركة السير	% 60	رست صفقة الدراسات	% 40	% 60

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
204	10.2	مشاريع أفقية	دراسة لتحديد مواقع الحاويات	تحسين جودة الخدمات	% 60	-	% 0	% 100
205	10.3	مشاريع أفقية	دراسة متعلقة بمحطات تغيير وسائل النقل	تحسين حركية السير	% 60	رست صفحة الدراسات	% 40	% 60
206	10.7	مشاريع أفقية	دراسة مخطط النقل والمسار السياحي	تحسين خدمة النقل السياحي	% 60	رست صفحة الدراسات	% 40	% 60
207	10.9	مشاريع أفقية	دراسة مخطط تحسين السلامة الطرقية	تحسين حركية السير	% 100	في طور الدراسة	% 40	% 60
208	10.10	مشاريع أفقية	الدراسات وخدمات المراقبة المتعلقة بأشغال الطرق	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 20	رست صفحة الدراسات	% 40	% 60

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
209	10.11	مشاريع أفقية	الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي	إعداد البطاقة التقنية المفصلة للمشروع	% 15	أُنجزت الصفقة مع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لربط مشاريع الجماعة بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي	% 60	% 40
210	10.13	بنسركا و تمديد الطريق المزدوج الوفاق، تمديد شارع 2 مارس وطرق الربط بأحياء الفرج، الوفاق وفونتي، تمديد شارع جمال عبد الناصر، طرق الربط بحي الفرج	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	تحسين الحركة الحضرية	% 40	تم الإعلان عن صفقة الدراسات	% 60	% 40

نسبة الباقي إنجازه	نسبة الإنجاز التراكمية المحققه	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	المشروع	التوطين	الرمز	الرقم
% 40	% 60	رست صفقة الدراسات	% 40	تحسين الحركية الحضرية	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	تيكوين حي أساكا، تمديد شارع عثمان ابن عفان، المدار الطريقي لتيكوين، طريق أغزر العربا، الطريق الرابط بين ط ورقم 1 وأساكا، الطريق الرابط بين ط ورقم 1 والحاجب، الطريق الرابط بين الحاجب والدراركة، الطريق الرابط بين تيكوين وأيت ملول	10.14	211
% 60	% 40	في طور إعداد الدراسات	% 40	إعداد المذكرة التقنية للمشروع	إعداد الدراسات التقنية لهيئة الفضاءات الخضراء	أكادير	10.15	212

الرقم	الرمز	التوطين	المشروع	العمليات المتوقعة إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز التراكمية المتوقعة	العمليات التي تم إنجازها خلال 2018	نسبة الإنجاز المحققة	نسبة الباقي إنجازها
213	10.16	أنزا	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	20 %	في طور إعداد الدراسات	40 %	60 %
214	10.17	بنسركاو	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	20 %	في طور إعداد الدراسات	40 %	60 %
215	10.18	تيكوين	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	التشخيص التقني	100 %	في طور إعداد الدراسات	40 %	60 %
216	10.19	مشاريع أفقية	إنجاز دراسة من أجل الارتقاء باكاير إلى مدينة ذكية	إعداد البطاقة التقنية للمشروع	20 %	أنجزت دراسة داخلية	100 %	-

خلاصة تقدم إنجاز مشاريع التمويل الذاتي

من حيث الفعالية اتسمت سنة 2018 بتسجيل نسبة فعالية تراكمية متميزة حيث تجاوزت النسبة التراكمية المحققة 52 ٪ مقابل 44 ٪ كنسبة متوقعة، على سبيل المثال لا الحصر، حققت اشغال الطرق نسبة إنجاز تراكمية تعادل 57 ٪ في حين حققت الانارة 58 ٪ مقابل 42 ٪ كنسبة متوقعة لكليهما.

أما في ما يخص العقار نسجل نتائج مهمة في هذا الشأن حيث أن جل العقارات المخصصة لتوطين المشاريع المسجلة ببرنامج العمل الجماعي بوشرت بها مساطر التسوية خاصة مسطرة الكراء و التعبئة مما سيسهل مستقبلا تقدم وتيرة إنجاز المشاريع تبعا للبرنامج المسطر، وفي هذا الإطار تم عقد عدة لقاءات و اجتماعات رسمية مع المؤسسات المعنية للإسراع بهذا الملف وبالخصوص مؤسسة العمران والمديرية الجهوية لأملك الدولة والمديرية الجهوية للمياه و الغابات ومحادثة التصحر.

المشاريع بشرا كة 2

يضم هذا الجزء أهم الإجراءات التي تم القيام بها مع الشركاء سواء كانوا ضمن المصالح اللامركزية أو باقي الجماعات الترابية أو القطاع الخاص ... وذلك في إطار متابعة تنزيل المشاريع المشتركة المقترحة في برنامج عمل جماعة أكادير.



منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أنزا	232	فضاء المتقاعدين	حديقة الأمل	-		احيل الى المشاريع الممولة ذاتيا
أكادير	233	منطقة الأنشطة الاجتماعية	على طول مستشفى الحسن الثاني	5 000 000 درهم	بشراكة مع مؤسسة الجنوب	تم التوقيع على الاتفاقية
تيكوين	234	المركب السوسيو ثقافي	دار الطالبة تيكوين	5 000 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تم التوقيع على الاتفاقية
أكادير	235	المعهد الموسيقي	شارع المقاومة	5 000 000 درهم	بشراكة مع وزارة الثقافة	
أكادير	236	تأهيل المواقع التاريخية	أكادير أوفلا وتبرجت القديمة	4 000 000 درهم	بشراكة مع الجهة ووزارة الثقافة	انجزت الدراسة
أكادير	237	فضاء ثقافي	جزئة الهدى	5 000 000 درهم	بشراكة	
أكادير	238	متحف النحت	حديقة أولهاو	1 000 000 درهم	بشراكة مع وزارة الثقافة	المعرض الوطني للنقوش الصخرية في طور الانجاز.

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أكادير	239	مسرح	حي فوتي		بشراكة مع وزارة الثقافة وجهة سوس- ماسة	تم التوقيع على الاتفاقية مع الشركاء
أكادير	240	القاعة المغطاة	تجزئة الهدى	12 500 000 درهم		
بنسركاو	241	فضاء رياضي	حي فوتي		بشراكة مع الثانوية الفرنسية	
أكادير	242	مسبح	حي الهدى	10 000 000 درهم		
تيكوبن	243	مسبح	فضاء دار الحي الزيتون		بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تعويضاً لمسبح أسكا تم تعيين المهندس المعماري
أكادير	244	ملعب الكرة الحديدية	ادرار		بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة الحديدية	
أكادير	245	رواق المعارض	الطريق الوطنية رقم 1	1 000 000 درهم	بشراكة مع جهة سوس ماسة	

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أكادير	246	تأهيل مركب الصناعة التقليدية	شارع 29 فبراير	6 000 000 درهم	بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي ' ولاية سوس-ماسة , مجلس جهة سوس- ماسة و غرفة الصناعة التقليدية	تم صرف الدفعات المالية المقررة والباقي في ذمة الجماعة 2 000 000 درهم
بنسركاو	247	حدائق	حديقة بمصوب واد سوس		بشراكة مع المياه والغابات	
تيكوين	248	حدائق	منطقة أخليج	1 000 000 درهم	بشراكة مع الجماعات المجاورة	في طور اعداد الشراكة مع الجماعات المجاورة
أكادير	249	مربد تحت أرضي بساحة الأمل	ساحة الأمل			
أكادير	250	فضاء تامونت لرعاية الشخص المسن	الحي المحمدي	كلفة العقار 500 000 درهم	بشراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	<ul style="list-style-type: none"> تم انجازه في طور التجهيز

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
أكادير	251	نادي الشباب	الحي المحمدي	كلفة العقار 500 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	في طور الانجاز
أكادير	252	ملاعب رياضية للقرب	الحي المحمدي	كلفة العقار 500 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تم افتتاحه
أكادير	3.6	تهيئة متحف الذاكرة	المقر القديم لبنك المغرب		بشراكة مع بنك المغرب	نقل من المشاريع الذاتية
	7.22	احداث محاور طرقية	اكادير الطريق المداري الكبير	750 000 000 درهم	بشراكة مع جهة سوس-ماسة، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز و وزارة الصناعة	الاتفاقية جاهزة
أكادير	4.12	إحداث القاعة المغطاة	دار الشباب الحي الحسني		بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة	
أكادير	5.3	ربط سوق الأحد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي ومياه إطفاء الحرائق والكهرباء والإنارة	سوق الأحد		بشراكة مع جهة سوس-ماسة، وزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة و شركة العمران	في طور الانجاز

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
اكادير	7.58	إحداث الخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية	أكادير ميناء الصيد البحري الحاجب		بشراكة مع مؤسسة التعاون	
بنسركاو	253	فضاء المرأة والطفل	حي الفرخ	كلفة العقار 500 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	<ul style="list-style-type: none"> المشروع: في طور الانجاز. صفحة التجهيز: في طور اعلان.
بنسركاو	2.14	إحداث فضاء المتقاعدين	بنسركاو منطقة ابن خلدون		بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	في طور الانجاز
أكادير	254	نادي الشباب	حي الكويرة	كلفة العقار 500 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	<ul style="list-style-type: none"> تم انجاز المشروع. في طور التجهيز.
تيكويين	255	تهيئة مركز محاربة داء السل	تيكويين	133 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز
تيكويين	256	انجاز المركز الصحي للشباب	تيكويين	500 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز

منطقة الانجاز	الرقم	اسم المشروع	التوطين	القسط المتحمل من طرف جماعة أكادير	الشركاء	الملاحظات
تيكويين	257	سيارة لنقل الأمصال	تيكويين	90 000 درهم	بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	أنجز
تيكويين المركز	7.9	تأهيل أزقة الأحياء	تيكويين المركز		في اطار سياسة المدينة	برنامج في طور التوقيع
تيكويين الحاجب	7.10	تأهيل أزقة الأحياء	تيكويين الحاجب		في اطار سياسة المدينة	برنامج في طور التوقيع
تيكويين	7.59	احداث منتزه اخضر	تيكويين أخليج		بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة والجماعات المجاورة	إتفاق مبدئي

3 مشاريع خارج برنامج عمل الجامعة

يضم هذا الجزء وضعية تقدم الدراسات والاشغال المتعلقة بالمشاريع الغير مدرجة في برنامج عمل الجامعة وهذا إلى غاية 31 دجنبر 2018.



الملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة	اسم المشروع	طبيعة المشروع	منطقة الانجاز
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	7 800 000 درهم	صيانة الطرق أحياء المسيرة والخيام	الطرق والتجهيزات العمومية	اكادير
المخطط الجماعي للتنمية / برنامج العمل	انتهاء الأشغال	16 000 000 درهم	صيانة الطرق أحياء بوتشكات و الحي الحسني		
	في طور الإنجاز الشطر الثاني	54 000 000 درهم	تهيئة حي تالبورجت		
في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة	في انتظار الاتفاقية	20 000 000 درهم	إحداث ساحات عمومية (حي تالبورجت سينما الصحراء و منطقة قصر البلدية)		
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	560 000 درهم	النفورات العمومية ممر أيت سوس		
	في طور الإنجاز	7 800 000 درهم	فضاء الترفيه واد لحوار		
اتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة	انتهاء الأشغال	33 000 000 درهم	أشغال الطرق، حي الهدى		
تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران	انتهاء اشغال الطرق	18 000 000 درهم	أشغال الطرق، الحي المحمدي		
في إطار مشروع حماية أكادير من الفيضانات	انتهاء الأشغال	3 800 000 درهم	تغطية واد تناوت شارع الجيش الملكي		

الملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة	اسم المشروع	طبيعة المشروع	منطقة الانجاز
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	6 000 000 درهم	المركب الثقافي خير الدين		
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	انتهاء الاشغال	2 500 000 درهم	فضاء المرأة والطفل بحي لكويرة		
	تم تجهيز الفضاء	500 000 درهم	تجهيز فضاء المرأة والطفل بالحي المحمدي		
توقيع اتفاقيتي الشراكة مع جمعيتين	تم تجهيز الفضاء	600 000 درهم	تجهيز مركز المرأة في وضعية صعبة بحي السلام		
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم 130 U INDH 2017	في طور انجاز الدراسات التقنية	2 700 000 درهم	تأهيل وتجهيز دار الحي وملعب القرب سفوح الجبال اغيل اضرور	البنيات	اكادير
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم 131 U INDH 2017	في طور انجاز الدراسات التقنية	2 700 000 درهم	تأهيل وتجهيز دار الحي وملعب القرب سفوح الجبال امونسيس		
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اتفاقية رقم 132 U INDH 2017	في طور انجاز الدراسات التقنية	2 600 000 درهم	تأهيل وتجهيز دار الحي وساحة متعددة الاستعمالات سفوح الجبال ايت المودن		
تمت تسوية العقار مع المياه والغابات	في طور انجاز الدراسات التقنية	-	إحداث مركز للتكوين المهني بتكوين		

ملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة	اسم المشروع	طبيعة المشروع	منطقة الانجاز
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تمت المصادقة من طرف اللجنة المحلية في انتظار المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية	7 270 000 درهم	بناء وتجهيز دار الحي بالحي المحمدي	البنائات	أكادير
		780 600 درهم	اقتناء حافلتين للنقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ حي أغروض		
شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن	انتهاء الأشغال	650 000 درهم	وضع لوحات الطاقة الشمسية قصر البلدية	الإنارة العمومية	
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	10 000 000 درهم	أشغال الإنارة العمومية بأحياء : شرف، إحشاش، الداخلة، أمسرنات، تدارت، زنقة محمد إقبال، شارع 18 نوبر، شارع الشيخ السعدي، شارع 2 مارس، شارع المقاومة، شارع القاضي عياض، الأزقة المؤدية إلى الكليات		
			مشروع إعادة هيكلة سفوح الجبال		

منطقة الانجاز	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الكلفة	تقدم الأشغال	الملاحظات
	الطرق والتجهيزات العمومية	أشغال الطرق، حي الوفاق	2 000 000 درهم	انتهاء الأشغال	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
		أشغال الطرق، حي أغروض الشطر الأول	1 300 000 درهم	انتهاء الأشغال	
		أشغال الطرق، حي أغروض الشطر الثاني		في طور الإنجاز	
بنسركا و	البنيات	إحداث مركز صحي، حي أغروض	23 000 000 درهم	انتهاء الأشغال	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
		أشغال صيانة البنيات الإدارية بالمستودع الجماعي	10 000 000 درهم	انتهاء الأشغال	المخطط الجماعي للتنمية
		تجهيز قاعة متعددة الاستعمالات بحي أغروض بنسركا و		تم تجهيز القاعة	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
	الإنارة العمومية	تهيئة وتجهيز المركز الصحي ودار الولادة بنسركا و	1 672 090,66 درهم	تمت المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية وتم الحصول على موافقة مندوبية الصحة	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
		أشغال الإنارة العمومية، الطريق الوطنية رقم 10، الشطر الأول - التحكم عن بعد-	3 000 000 درهم	انتهاء الأشغال	المخطط الجماعي للتنمية
		أشغال الإنارة العمومية، الطريق الوطنية رقم 10، الشطر الثاني	2 800 000 درهم	انتهاء الأشغال	المخطط الجماعي للتنمية

الملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة	اسم المشروع	طبيعة المشروع	منطقة الانجاز
تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران	انتهاء أشغال الشطر الأول	16 000 000 درهم	أشغال الطرق، حي تليلا	الطرق والتجهيزات العمومية	تيكويين
	انتهاء أشغال الشطر الأول	45 000 000 درهم	أشغال الطرق وتهيئة حي أدرار		
في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة	انتهاء الأشغال	17 000 000 درهم	أشغال الطرق ، حي أسكا		
	انتهاء أشغال الشطر الأول	10 000 000 درهم	أشغال الطرق ، حي الزيتون		
	انتهاء الأشغال	4 000 000 درهم	أشغال الطرق ، حي بئرانزان		
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	7 300 000 درهم	أشغال صيانة الطرق		
شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	تم تجهيز الورشتين	255 860 درهم	تجهيز ورشتي الفصالة والخياطة والتدبير المنزلي - أسكا بئرانزان-		
	تم تجهيز الورشتين	61 300 درهم	تجهيز ورشتي الحلاقة والتدبير المنزلي بمركب الحاجب تيكويين		
	المصادقة من طرف اللجنة المحلية في انتظار المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية	560 000 درهم	فضاء ترفيهي رياضي بتكويين		
المخطط الجماعي للتنمية / برنامج العمل	انتهاء الأشغال الشطر الأول	3 000 000 درهم	أشغال الإنارة العمومية أحياء تيكويين و حي تليلا		

منطقة الانجاز	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الكلفة	تقدم الأشغال	الملاحظات
أنزا	الطرق والتجهيزات العمومية	أشغال الطرق بأحياء أنزا وتدارت العليا		انتهاء أشغال الشطر الأول	تطبيق دفتر تحملات التجزئة من طرف مؤسسة العمران
		تهيئة الطريق المؤدي إلى تدارت	8 500 000 درهم	انتهاء الأشغال	
		الحماية من الفيضانات (بلوك د تدارت)	10 000 000 درهم	في انتظار الاتفاقية	في إطار الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
		تجهيز ورشتي التدبير المنزلي والحلاقة بالنادي النسوي لحي تدارت	61 300 درهم	تم تجهيز الورشتين	
البنيات		بناء وتجهيز قاعة للرياضة النسائية بأنزا العليا	1 400 000 درهم	تمت المصادقة من طرف اللجنة المحلية في انتظار المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية	شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
		بناء وتجهيز قاعة للرياضة النسائية بحي أنزا	1 400 000 درهم		
		فضاء المرأة والطفل ببلوك أحي أنزا العليا	5 423 600 درهم		
		نادي الشباب ببلوك أحي أنزا العليا	4 222 800 درهم		
		إحداث مسبح (حي أنزا)	4 200 000 درهم		

الملاحظات	تقدم الأشغال	الكلفة	اسم المشروع	طبيعة المشروع	منطقة الانجاز
المخطط الجماعي للتنمية	انتهاء الأشغال	3 000 000 درهم	أشغال الإنارة العمومية: أنزا المركز الملاحية شطر الطريق الوطنية رقم 1 من جهة أنزا	الإنارة العمومية	أنزا
	انتهاء الأشغال	1 300 000 درهم	أشغال الربط بالشبكة الكهربائية بحي تدارت		
	انتهاء الأشغال	900 000 درهم	أشغال الإنارة العمومية الطريق الوطنية رقم 1 (المحور الرابط بين أنزا و أورير)		
تم انجاز 60% من المشروع	في طور الانجاز	1 651 000 درهم	المخطط المديرية لتهيئة الانارة العمومية		
	في طور الانجاز	1 650 000 درهم	تهيئة أشغال كبرى بالمساحات الخضراء		
	في طور الانجاز	1 498 000 درهم	ترشيد استهلاك المياه: الري بالتنقيط		
رقم 1.2 برنامج العمل الجماعي	في طور الانجاز		شهادة المطابقة للمعايير المعمول بها (مختبر المكتب الصحي الجماعي)		



الفصل الثالث :

الإمكانيات العالية المرصودة للمشاريع

1 الإمكانيات المالية المرصودة لبرنامج عمل جماعة أكادير

المبالغ المرصودة خلال 2017 - 2018 - 2019

في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج عمل جماعة أكادير 2017-2022 تم توزيع المبالغ المرصودة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 و نهاية دجنبر 2019 على النحو التالي:

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
1.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الادارية	تبسيط الولوج و اقتصاد الطاقة	7 390 000,00
1.2	أكادير	تجهيز المكتب الصحي الجماعي	تحسين أداء الخدمات	3 500 000,00
1.3	أكادير	تهيئة المقدرات الادارية: المحطة الطرقية، مقر الجماعة، الملحقات الجماعية	تكريس ادارة القرب و تحسين أداء الخدمات	5 130 000,00
1.7	مشاريع أفقية	اقتناء الأراضي، احتلال الملك الغابوي، نزع الملكية	توفير الوعاء العقاري لانجاز المشاريع و منها 21000000 درهم لسفوح الجبال	3 510 000,00
1.8	مشاريع أفقية	اقتناء الشاحنات والآليات	تعزيز و تحديث الأسطول الجماعي	38 565 857,05
1.11	أنزا	تأهيل المستودع الجماعي		
1.12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المدجز	تعزيز المرافق الجماعية	

الرمز	التوظيف	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
1.13	أكادير شارع محمد الشيخ السعدي	إتمام أشغال وتجهيز المكتب الصحي الجماعي	تعزيز المرافق الجماعية	2 500 000,00
1.11	أنزا	تأهيل المستودع الجماعي	تعزيز المرافق الإدارية الجماعية	
1.12	أكادير	إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز	تعزيز المرافق الجماعية	
1.4	أكادير تجزئة الهدى	إحداث مكتب الحالة المدنية	تكريس ادارة القرب	14 048 117,79
1.5	أكادير رياض السلام	إحداث مكتب الحالة المدنية	تكريس ادارة القرب	
2.20	أكادير مقابر إحشاش القديم، النجاح والحي المحمدي	تهيئة المقابر	الاعتناء بفضاءات المقابر	7 500 000,00
2.21	تيكويين مقابر تيليللا، آيت القاضي وإيمو نسييس	تهيئة المقابر	الاعتناء بفضاءات المقابر	
2.22	أنزا تدارت	تهيئة المقبرة	الاعتناء بفضاءات المقابر	
2.23	بنسركاو	تهيئة المقبرة	الاعتناء بفضاءات المقابر	
2.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنيات الاجتماعية	تحديث البنيات الجماعية للاستجابة لمعايير تبسيط الولوج و اقتصاد الطاقة	8 600 000,00
2.8	مشاريع أفقية	صيانة المؤسسات التعليمية	المساهمة في الرقي بالبنيات المدرسية	5 000 000,00
2.13	أكادير حي المسيرة	إحداث فضاء المتقاعدين	العناية بشؤون المتقاعدين	1 700 000,00

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
2.19	تيكوين حي الزيتون	توسيع الحضانة	العناية بشؤون المرأة و الطفل	600 000,00
2.17	أكادير رياض السلام	إحداث نادي نسوي ودار الشباب	تكريس مقاربة النوع	4 500 000,00
2.4	أنزا حي تدارت بلوك د	إحداث فضاء المتقاعدين	العناية بشؤون المتقاعدين	870 000,00
2.5	أكادير حي الوداديات	تهيئة المركب الاداري والاجتماعي	توفير فضاء لتأطير و ممارسة العمل الجمعي	
2.6	أكادير حي أمسرنات	إعادة بناء فضاء للأنشطة الاجتماعية (الخرانة الحالية)	توفير فضاء لتأطير و ممارسة العمل الجمعي	
2.13	أكادير حي المسيرة	إحداث فضاء المتقاعدين	العناية بشؤون المتقاعدين	
2.15	تيكوين بالقرب من مسجد أساكا	إحداث فضاء المتقاعدين	العناية بشؤون المتقاعدين	
2.19	تيكوين حي الزيتون	توسيع الحضانة	العناية بشؤون المرأة و الطفل	
3.1	مشاريع أفقية	صيانة وتجهيز البنايات الشقافية		
3.4	أكادير مركب محمد جمال الدرّة	تهيئة قاعة الأنشطة الشقافية	تعزيز البنية الشقافية	2 331 139,41
3.7	بنسركاو حي الوفاق	إحداث مركب ثقافي	تعزيز البنية الشقافية	7 500 000,00

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
3.2	بنسركاو أغروض بالقرب من المركز السوسيو ثقافي	إحداث دار الحي		1 900 000,00
3.4	أكادير مركب محمد جمال الدرّة	تهيئة قاعة الأنشطة الثقافية	تعزيز البنية الثقافية	
3.5	أكادير رياض السلام	إحداث قاعة متعددة الاستعمالات الثقافية	تعزيز البنية الثقافية	
3.9	أكادير حي الخيام (مكتب الحالة المدنية الحالي)	تهيئة المركب الثقافي	تعزيز البنية الثقافية	
3.10	تيكوين المركز الثقافي الحالي	تهيئة المركز الثقافي	تعزيز البنية الثقافية	
3.11	أكادير مسرح الهواء الطلق	صيانة مسرح الهواء الطلق	تعزيز البنية الثقافية	
3.12	أكادير تمديد الداخلة قرب ثانوية شوقي	إحداث دار الحي	تعزيز البنية السوسيو ثقافية	
4.22	أكادير الانبعاث	إحداث المسبح الاولمبي	تعزيز البنية الرياضية	5 000 000,00
4.13	بنسركاو الملعب الرياضي الوفاق	إحداث قاعة مغطاة	تعزيز البنية الرياضية	7 500 000,00
4.26	أنزا العليا بلوك أ تدارت	إحداث فضاء رياضي	تعزيز الفضاءات الرياضية	5 300 000,00
4.18	بنسركاو أغروض على مستوى الطريق الوطنية رقم 10%	إحداث مسبح	تعزيز البنية الرياضية	
4.1	مشاريع أفقية	صيانة وصيانة التجهيزات الرياضية وفضاءات الاستجمام	تحسين جودة التجهيزات	18 000 000,00 درهم

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
4.3	بنسركاو بجانب الطريق الوطنية رقم 10%	إحداث فضاء ترفيهي	تعزيز فضاءات الترفيه	5 410 525,29
4.7	تيكوين الزيتون الشطر الثاني	إحداث فضاء رياضي و ترفيهي	تعزيز فضاءات الترفيه	
4.14	تيكوين ملعب مداني تيكوين	إحداث قاعة مغطاة	تعزيز البنية الرياضية	
4.15	أكادير	صيانة مركب الانبعاث	تعزيز البنية الرياضية	
4.16	أكادير الحي المحمدي	إحداث مسبح	تعزيز البنية الرياضية	
4.17	بنسركاو بالملعب الرياضي الوفاق	إحداث مسبح	تعزيز البنية الرياضية	
4.18	بنسركاو أغروض على مستوى الطريق الوطنية رقم 10%	إحداث مسبح	تعزيز البنية الرياضية	
4.20	أنزا المركب الرياضي أنزا المركز	إحداث القاعة المغطاة	تعزيز البنية الرياضية	
4.21	أنزا العليا تدارت	إحداث القاعة المغطاة	تعزيز البنية الرياضية	
4.23	أنزا المركب الرياضي	تهيئة الملعب الرياضي	تعزيز البنية الرياضية	
4.24	أكادير الحي المحمدي	إحداث فضاء رياضي و ترفيهي	تعزيز فضاءات الترفيه	
4.26	أنزا العليا بلوك أ تدارت	إحداث فضاء رياضي	تعزيز فضاءات رياضية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
5.3	أكادير	ربط سوق الأحد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي ومياه إطفاء الحرائق والكهرباء والانارة	تأهيل المرافق التجارية	3 500 000,00
5.2	أكادير	إعادة تهيئة السوق البلدي	تأهيل المرافق التجارية	5 520 000,00
5.6	أنزا حي تدارت بلوك د	إعادة تهيئة سوق تلبرجت	تنظيم الأنشطة التجارية	
5.4	أنزا حي تدارت بلوك ب	إحداث سوق بتدارت	تنظيم الأنشطة التجارية	7 020 000,00
5.5	أكادير	إحداث سوق بتدارت	تأهيل المرافق التجارية	
6.5	مشاريع أفقية	إحداث مراكز التحويل	الرفع من جودة الشبكة الكهر بائية	600 000,00

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
6.1	مشاريع أفقية	فصل شبكة الانارة العمومية عن شبكة المكتب الوطني للكهرباء	الرفع من جودة شبكة الانارة العمومية	27 880 902,27
6.7	أنزا الحسنية	أشغال الانارة والكهرباء	الرفع من جودة شبكة الانارة العمومية	
6.8	أنزا تدارت - الهاروشي	أشغال الانارة والكهرباء	الرفع من جودة شبكة الانارة العمومية	
6.13	أكادير أحياء السلام، الشرف، الشريط السياحي، الوداديات، البحارة، الاتبعات، الداخلة، القدس، أيت تاو وكت، أيت المودن، إيمونسيس، أحلاكا، إليغ، الإقامة، تلبرجت، الوفاء، المختار السوسي، الفضية، تمديد الداخلة، المسيرة، رياض السلام، سيدي يوسف، العزيب، الخيام 1 و 2، بواركان، النجاح، النهضة، تمديد X، الحي الاداري، محيط المحطة الطرقية والسوق المغطى وقرية الأطفال والعمارة A، الحي الصناعي والقصبة	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.16	بنسركاو بوتاسرا	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.22	تيكوين تيليلدا	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
6.23	تكوين دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.24	تكوين شارع تودرت	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.26	تكوين الطريق الرابط بين أساكا وتاسيلا	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.27	تكوين الطريق الرابط بين تكيوين والاشيرة عبر دوار الصوري	أشغال الإنارة العمومية	تعميم الإنارة العمومية	
6.28	مشاريع أفقية	تأهيل انارة الملاعب الرياضية	تأهيل المرافق الرياضية	
6.34	أكادير	إضاءة الشاطئ بمصايح اقتصادية	النجاعة الطاقية	
7.5	أنزا	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	24 000 000,00
7.8	بنسركا و منطقة بوتاسرا	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.9	تكوين المركز	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.10	تكوين الحاجب	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.11	تكوين الزيتون	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.12	تكوين تيللا	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
7.13	مشاريع أفقية	تزويد المدينة بأثاث حضري عصري	الرقى بجمال المدينة	2 000 000,00
7.14	مشاريع أفقية	تجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي	تحسين حركة السير	1 000 000,00
7.15	مشاريع أفقية	تحديث شبكة الإشارات الضوئية	تحسين حركة السير	4 000 000,00
7.19	تيكويرن أساسيس	إحداث ساحة عمومية	تعزير فضاءات الترفيه	1 300 000,00
7.25	أكادير	تهيئة الشبكة الطرقية	تحسين الحركة الحضرية	355 000 000,00
7.26	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.27	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.28	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.29	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.30	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.31	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.32	أكادير	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.12	تيكويرن تيليللا	تأهيل ازقة الاحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
7.13	مشاريع أفقية	تزويد المدينة بأثاث حضري عصري	الرقى بجمال المدينة	2 000 000,00
7.14	مشاريع أفقية	تجهيز المدينة بعلامات التشوير التوجيهي	تحسين حركة السير	1 000 000,00
7.15	مشاريع أفقية	تحديث شبكة الإشارات الضوئية	تحسين حركة السير	4 000 000,00
7.19	تكوين أسايس	إحداث ساحة عمومية	تعزيز فضاءات الترفيه	1 300 000,00
7.25	أكادير	تهيئة الشبكة الطرقية	تحسين الحركة الحضرية	355 000 000,00
7.26	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.27	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.28	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.29	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.30	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.31	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.32	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.33	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.34	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.35	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.36	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.37	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.38	أكادير	تهيئة الشوارع		
7.39	أكادير	تهيئة الشوارع		

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
7.53	أكادير واد الحوار	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	تحسين الحركة الحضرية	12 000 000,00
7.57	تيكوين واد اغزر العربا	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)	تحسين الحركة الحضرية	3 000 000,00
7.6	أكادير سفوح الجبال	تهيئة الشبكة الطرقية	تحسين جودة الشبكة الطرقية	11 000 000,00
7.60	مشاريع أفقية	احداث فوهات لإطفاء الحريق	تعزيز معايير السلامة	1 000 000,00
7.67	تيكوين عبر الطريق السيار	تأهيل مدخل المدينة	تحسين المنظر العام لمدخل المدينة	13 800 000,00
7.66	تيكوين الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة		
7.65	بنسركاو الطريق الوطنية رقم 10%	تأهيل مدخل المدينة		
7.64	أنزا الطريق الوطنية رقم 1	تأهيل مدخل المدينة		
7.63	أكادير الطريق الوطنية رقم 1	المحور الطرقي شارع الجيش الملكي الميناء وبعض المدارات		
7.57	تيكوين واد اغزر العربا	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)		
7.55	أكادير واد تناوت	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)		
7.53	أكادير واد الحوار	إنجاز المنشآت الفنية (القناطر وتغطية الأودية)		
7.52	تيكوين الطريق المزدوج شرق غرب والطرق المداري تيللا أدرار	أشغال تمديد الطرق		

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
7.51	بنسركاو العيون	تهيئة الشوارع	تحسين الحركة الحضرية	
7.50	أنزا شارع المحيط	تهيئة الشوارع		
7.49	أنزا طريق الملاحه	تهيئة الشوارع		
7.48	أكادير طرقات المخيم، تليرجت القديمة والمرابد	تهيئة الشوارع		
7.47	أكادير شارع عمر الخيام	تهيئة الشوارع		
7.46	أكادير شارع محمد إقبال	تهيئة الشوارع		
7.45	أكادير شارع كينيدي	تهيئة الشوارع		
7.44	أكادير شارع 29 فبراير	تهيئة الشوارع		
7.43	أكادير زنقة المعرض	تهيئة الشوارع		
7.41	أكادير شارع ولي العهد	تهيئة الشوارع		
7.40	أكادير زنقة وجدة	تهيئة الشوارع		
7.24	أكادير الحزام السياحي والشاطئي، إيغ، شارع الجيش الملكي	إحداث مرابد		
7.23	أكادير طرق تليلا محيط غرفة التجارة	إحداث محاور طرقية		
7.21	أكادير طريق تليلا الحي المحمدي	إحداث محاور طرقية		
7.17	أكادير الحي المحمدي	إحداث ساحة عمومية		
7.16	أكادير تجزئة الهدى	إحداث ساحة عمومية	تعزيز فضاءات الترفيه	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
7.12	تيكوين تيللا	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.11	تيكوين الزيتون	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.10	تيكوين الحاجب	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.9	تيكوين المركز	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.8	بنسركاو منطقة بوتاسرا	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.7	أنزا المركز وتدارت	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.6	أكادير سفوح الجبال	تهيئة الشبكة الطرقية	تحسين جودة الشبكة الطرقية	
7.5	أكادير أحياء إحشاش، الوداديات، العزيز، القصبة، تلضي، الحي الحسني، الحي المختلط، القدس، الكويرة، الخيام، ساطاس وتلبرجت	تأهيل أزقة الأحياء	تحسين جودة الشبكة الطرقية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
8.1	أكادير	تهيئة المساحات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	31 722 105,15
8.2	أنزا			
8.3	بنسركاو			
8.4	تيكويين			
8.9	أكادير حديقة محمد جمال الدرة			
8.11	أكادير حديقة الهدى (فضاء المتقاعدين)	تأهيل الحدائق	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	6 800 000,00
9.1	مشاريع أفقية	عصرنة البنية التحتية الالكترونية للجماعة	تعزيز اسس و مبادئ الحکامة وإدارة الذکة	7 260 882,94
10.1	مشاريع أفقية	دراسة لإعداد مخطط حركة السير والتشوير	تحسين حركة السير	10 700 000,00
10.2	مشاريع أفقية	دراسة لتحديد مواقع الحاويات	تحسين جودة الخدمات	
10.3	مشاريع أفقية	دراسة متعلقة بمحطات تغيير وسائل النقل	تحسين حركة السير	
10.7	مشاريع أفقية	دراسة مخطط النقل والمسار السياحي	تحسين خدمة النقل السياحي	
10.9	مشاريع أفقية	دراسة مخطط تحسين السلامة الطرقية	تحسين حركة السير	
10.10	مشاريع أفقية	الدراسات وخدمات المراقبة المتعلقة بأشغال الطرق	تحسين جودة الشبكة الطرقية	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
10.11	مشاريع أفقية	الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي	تحسين جودة شبكتي الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي	
10.13	بنسركا و تمديد الطريق المزدوج الوفاق، تمديد شارع 2 مارس و طرق الربط بأحياء الفرخ، الوفاق و فوتني، تمديد شارع جمال عبد الناصر، طرق الربط بحي الفرخ	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	تحسين الحركة الحضرية	
10.14	تيكوين حي أساكا، تمديد شارع عثمان ابن عفان، المدار الطريقي لتيكوين، طريق أغزر العربا، الطريق الرابط بين ط ورقم 1 وأساكا، الطريق الرابط بين ط ورقم 1 والحاجب، الطريق الرابط بين الحاجب والدراركة، الطريق الرابط بين تيكوين وأيت ملول	دراسة متعلقة بإنشاء الطرق	الحركة الحضرية	
10.15	أكادير	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	
10.16	أنزا	إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	

الرمز	التوطين	المشروع أو العملية	الاهداف	المبلغ المرصود بالدرهم
10.17	بنسركا و	إعداد الدراسات التقنية لهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	
10.18	تيكويين	إعداد الدراسات التقنية لهيئة الفضاءات الخضراء	تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة	
10.19	مشاريع أفقية	انجاز دراسة من أجل الارتقاء بأكادير الى مدينة ذكية		
المجموع العام				703 022 426,63

فُوْجَز البرمجة المالية لسنوات 2017 - 2018 - 2019

القرن	المجال	البرمجة بالدرهم
1	مجال البنيات الإدارية	74 643 974,84
2	المجال الاجتماعي	28 770 000,00
3	المجال الثقافي	25 824 036,14
4	المجال الرياضي	44 680 525,29
5	المجال الاقتصادي	16 040 000,00
6	الكهرباء و الإنارة العمومية	28 480 902,27
7	التهيئة الحضرية	428 100 000,00
8	المساحات الخضراء	38 522 105,15
9	المعلومات	7 260 882,94
10	الدراسات	10 700 000,00
المجموع العام		703 022 426,63

2 مشاريع ذات إكراهات والحلول المقترحة

الرمز	التوطين	المشروع	نوعية الإكراه	الإجراءات المقترحة
1.6	أنزا العليا بلوك ب تدارت	إحداث مكتب الحالة المدنية	إكراه عقاري	تم إدماجه بمشروع رقم 1.3
1.10	أكادير تمديد الداخلة، محور شمال جنوب	إحداث مركز إداري	إكراه عقاري	تم إدماجه بمشروع رقم 1.5
2.7	بنسركا وحي الوفاق بالقرب من الملعب الرياضي	إحداث فضاء الأنشطة الاجتماعية	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
2.10	أكادير رياض السلام	إحداث فضاء الاستجمام (وحدتين)	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
2.11	أكادير شارع الحسن الأول الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
2.12	أكادير شارع 11 بناير الداخلة	إحداث فضاء الاستجمام	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
3.3	أكادير زنقة التعاون تبرجت	تهيئة ساحة ذاكرة أكادير	إكراه جيوتقني	إقتراح إنجاز دراسة جيوتقنية

الرمز	التوطين	المشروع	نوعية الإكراه	الإجراءات المقترحة
3.12	أكادير تمديد الداخلية قرب ثانوية شوقي	إحداث دار الحي	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
4.6	تيكوين لاريب الحاجب	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
4.9	تيكوين أيت القاضي	إحداث فضاء رياضي وترفيهي	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
4.16	أكادير الحي المحمدي	إحداث مسبح	إكراه جيوتقني	إقتراح إعادة النظر في طبيعة المشروع
4.25	أكادير تمديد الداخلية	إحداث فضاء ترفيهي	إكراه عقاري	تغيير الموقع وإدماجه في مشروع رقم 8.7 ملتقى شرق/غرب
7.18	بنسركاو ساحة عيساوة	إحداث ساحة عمومية	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل
7.19	تيكوين أسايس	إحداث ساحة عمومية	إكراه عقاري	البحث عن موقع بديل

خلاصة عامة

تميزت سنة 2018، كما هو مبين في الجداول الواردة في التقرير، بتحقيق نسب مهمة في وتيرة إنجاز المشاريع رغم بعض العوائق والاكراهات التي تحول دون إنجاز بعضها في الوقت المحدد، لقد استطاعت الجماعة خلال هذه السنة مواصلة إنجاز مئتي وستة عشر مشروعاً (216) في إطار مشاريع التمويل الذاتي، أي ما يعادل نسبة إنجاز إجمالية تراكمية تفوق 52 ٪، في حين كانت نسبة الإنجاز الإجمالية المتوقعة لا تتعدى 44 ٪.

كما عرفت بعض المشاريع تقدماً ملموساً في وتيرة الإنجاز بعدما تم تسوية الاختلالات التي كانت تعترضها، ونخص بالذكر الاختلالات المسطرية. كما يتبين من خلال الجداول أن المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة لم يتم إنجاز بعضها، وبعضها الآخر عرف وتيرة تنزيل بطيئة نظراً لتأخر بعض الشركاء في الوفاء بالتزاماتهم باستثناء المشاريع المزمع إنجازها في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


وفي هذا الإطار ستواصل الجماعة التنسيق مع الشركاء خصوصاً بعد صدور ميثاق اللاتمركز الذي ينص على تبسيط المساطر وبالتالي تسريع وتيرة إنجاز المشاريع في إطار الشراكة. الإكراه العقاري يطرح نفسه باستمرار لأسباب متعددة حيث بلغ عدد المشاريع التي تعرف إكراهاً عقارياً أربعة عشر (14) مشروعاً سيتم تقديم بدائل لها.

وفي الختام، جدير بالذكر أن في السنة المقبلة سيقوم المجلس الجماعي خلالها بتحيين برنامج عمل الجماعة مما سيخول إعادة تحديد الأولويات تماشياً مع السياق التنموي على المستوى المحلي والجهوي، الشيء الذي سيشكل فرصة مميزة لتعزيز موقع مدينتنا كقطب جهوي يقود قاطرة التنمية إلى الأفضل.




ملاحق :

توطيين وصور بعض المشاريع

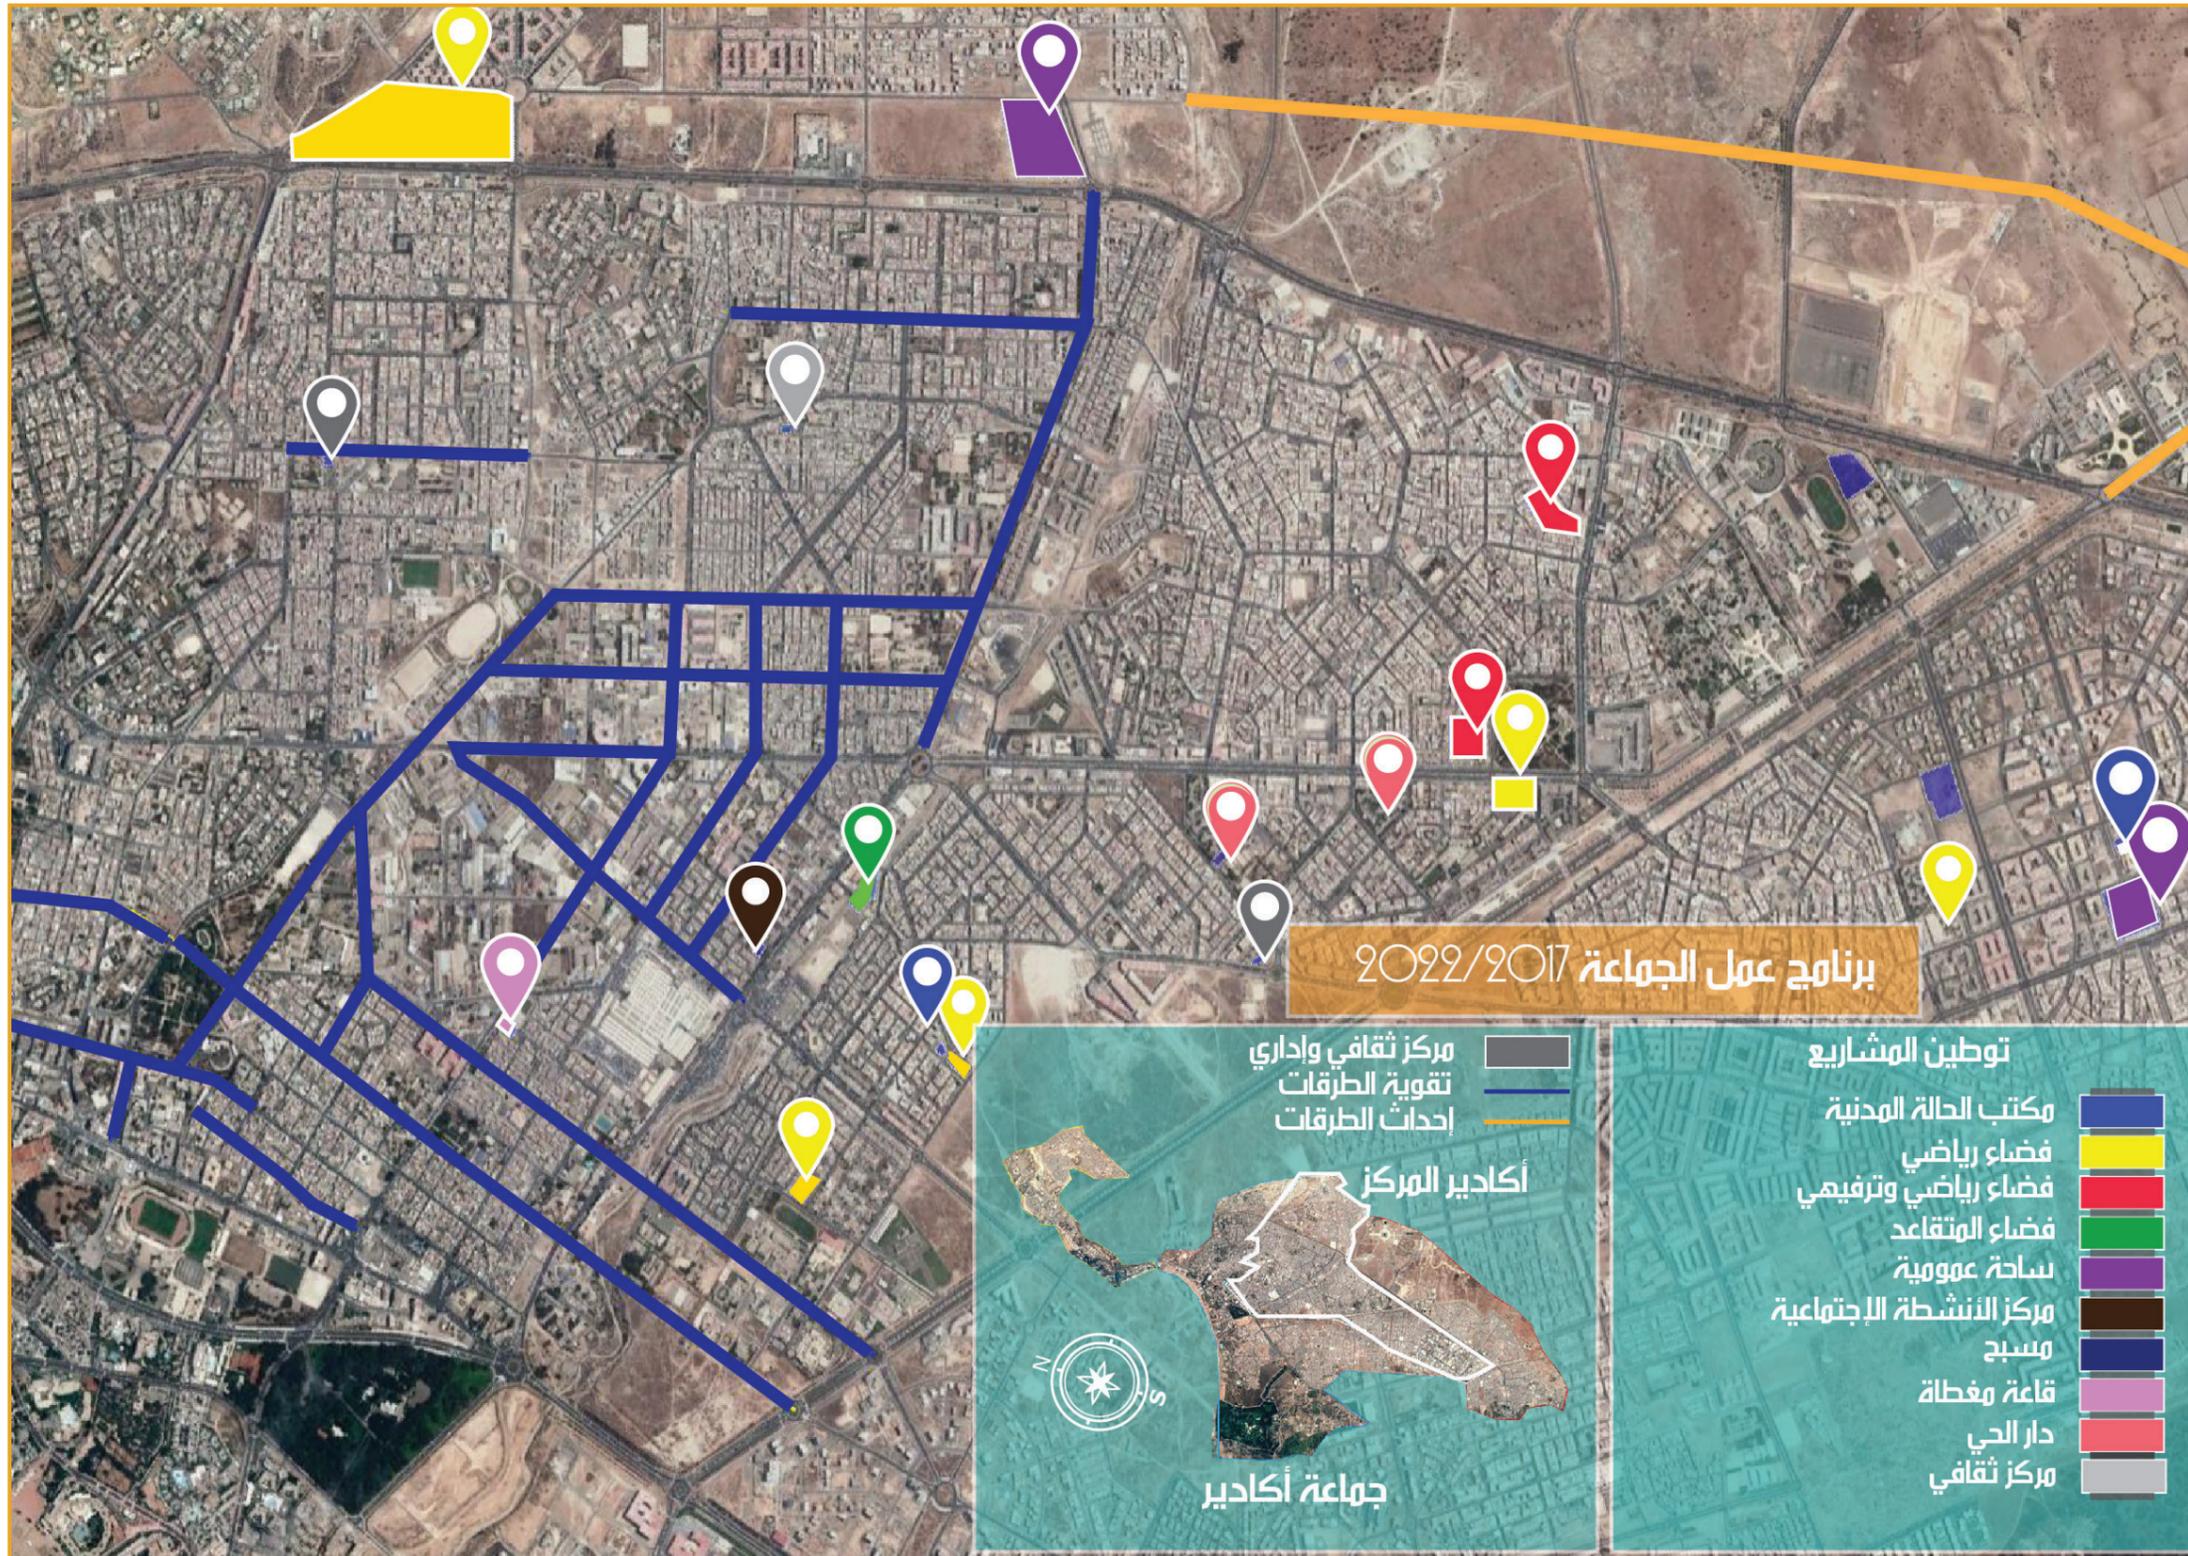

المشاريع
الموطة
بمنطقة
أكادير
المركز

1

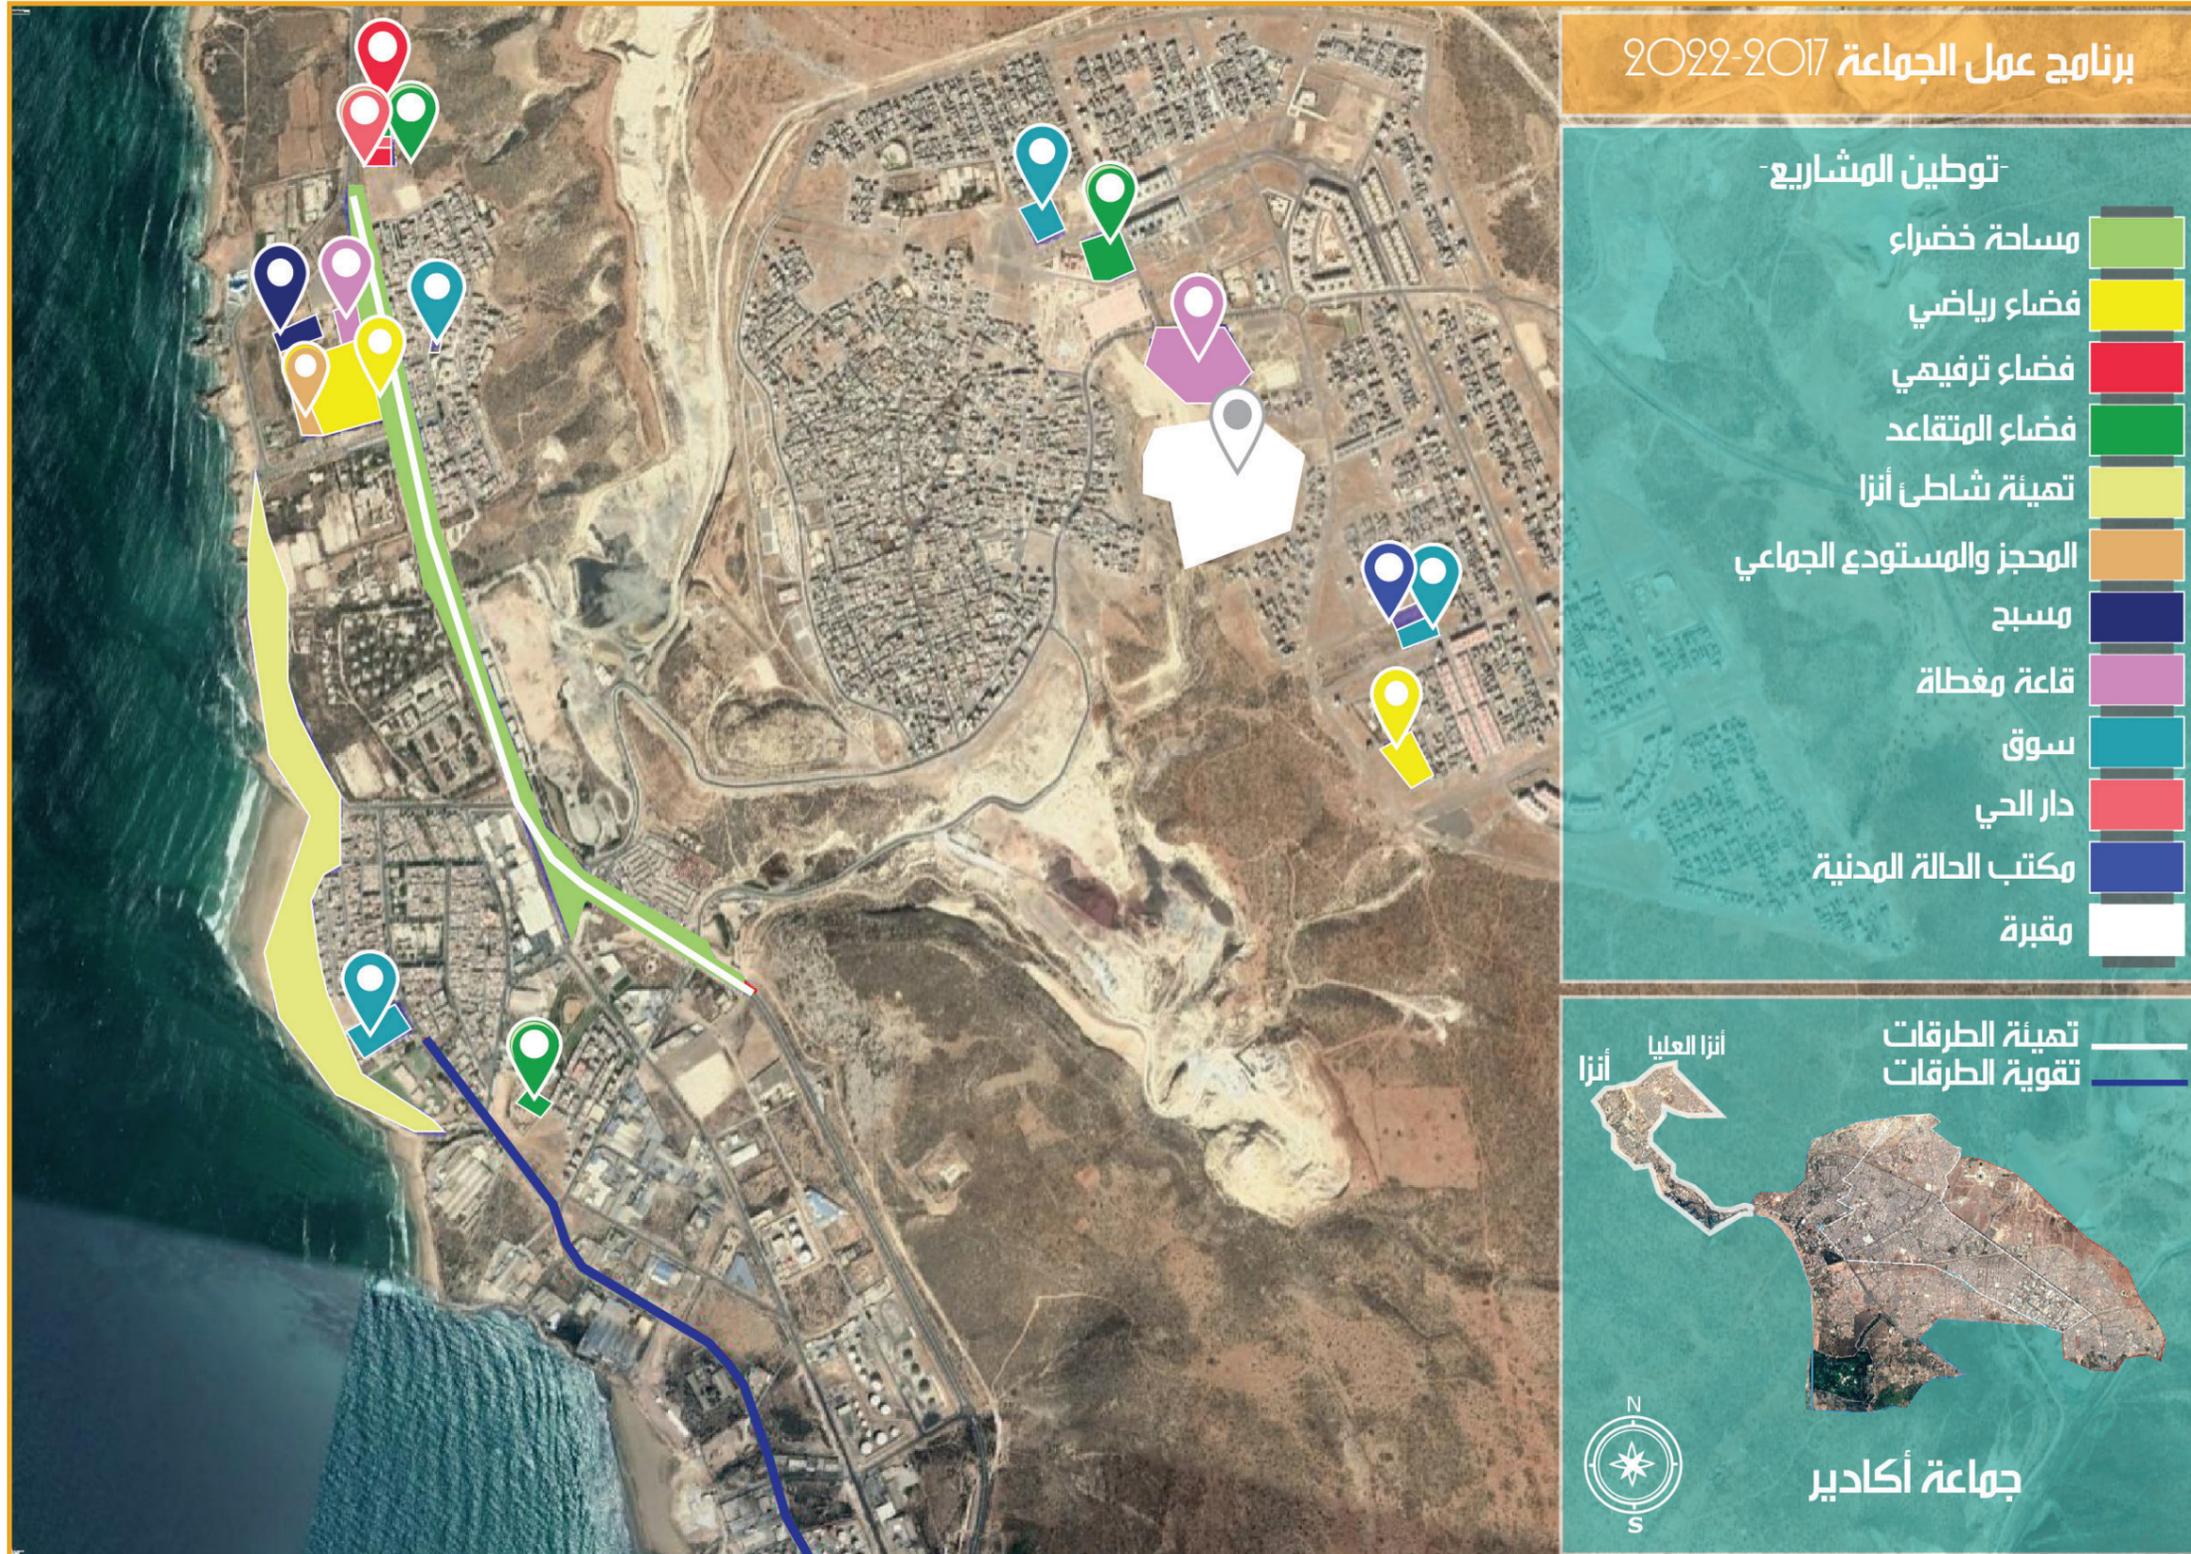

المشاريع
الموظنة
بمنطقة
أنزا



3

المشاريع
الموطة
بمنطقة
تكوين



4
المشاريع
الموظنة
بمنطقة
أكادير
المحيط
و بنسركاو



5
- أ -
صور بعض
المشاريع



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'INTERIEUR
REGION SOUSS MASSA
PREFECTURE D'AGADIR IDAOUTANANE

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سويس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
Initiative Nationale pour le Développement Humain

مشروع بناء فضاء المرأة و الطفل بحي الفرح بنسركاو (م.و.ت.ب)
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE FEMME ET D'ENFANT AU QUARTIER ALFARAH
COMMUNE D'AGADIR, PREFECTURE AGADIR IDAOUTANANE (I.N.D.H)

COUT DU PROJET :
3 951 299.20 DH TTC

DUREE DU PROJET :
10 MOIS

ARCHITECTE :
Mr LKHOLTI NOREDDINE
Tel /Fax : 05 28 84 26 23

MAITRE D'OUVRAGE:
PREFECTURE AGADIR IDAOUTANANE

BUREAU D'ETUDE:
BET BIEN
Tel /Fax : 05 28 84 73 27

BUREAU DE CONTROLE:
SOMACEP
Tel /Fax : 05 28 82 66 60


LABORATOIRE:
LGCI
Tel : 05 28 26 28 26
Fax : 05 28 26 28 27

ENTREPRISE:
Sté SOGUAMAC
Tel /Fax : 05 28 21 21 07





5 - ب -
صور بعض
المشاريع

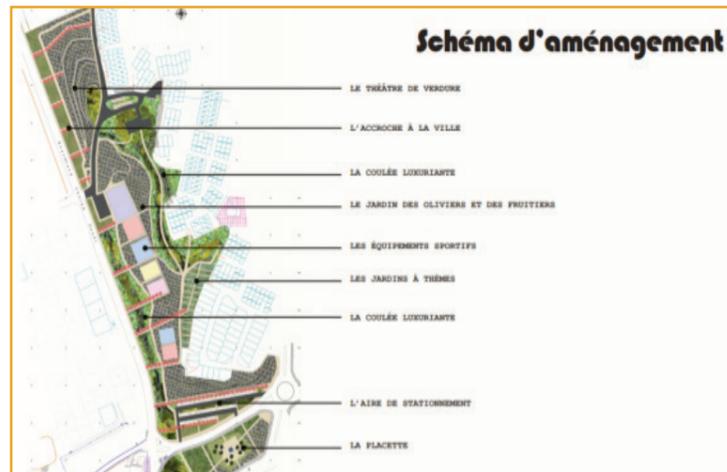

TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC LOT N°3 :
RUE OUSNAL - QUARTIER BASSANA EL HARROUCHIA - SAKRAËL-AGADIR

شغال الإنارة العمومية
الشارع الثالث

رقة الوصال من الساعة والبروش من تارتاك أكادير

MAITRE D'OUVRAGE :
LABORATOIRE :
ENTREPRISE :
DELAJ :
SITE WEB DE LA COMMUNE



شغال التهيئة الحضرية للطرق الشطر الثاني
شارع القاضي عياض - شارع البكاي
شارع المقاومة - شارع محمد بلحسن الوزاني

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS URBAINS DE VOIRIE LOT N°2 :
AVENUE MOQUAOUAMA - AVENUE MOHAMMED BLHASSANE OUAZZANIE - AVENUE CADI AYYAD - AVENUE BEKKAY

MAITRE D'OUVRAGE :
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES : NOVEC
LABORATOIRE : LPEE

VINCI
Cegelec
www.vinci-energies.ma

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
REGION SOUSS MASSA
PREFECTURE AGADIR IDA OUTANANR
COMMUNE D'AGADIR

www.agadir.ma

TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 2017 LOT N° 4:
BOUTASSRA, ENTOURAGE DE LA GARE ROUTIERE ET AVENUE AAKKAD

شغال الإنارة العمومية 2017 حصة رقم 4
حي بوتاسرة، محيط المحطة الطرقية وشارع العقاد أكادير

AVENUE AAKKAD & ENTOURAGE DE LA GARE ROUTIERE
BOUTASSRA

Marché n°93/2017

MAITRE D'OUVRAGE: COMMUNE D'AGADIR	LABORATOIRE: LPEE	ENTREPRISE: CEGELEC	DELAJ: 9 MOIS
---------------------------------------	----------------------	------------------------	------------------

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
جامعة أكادير

التقرير السنوي

2018

لتقدم تنفيذ برنامج عمل
جامعة أكادير 2017-2022

جامعة أكادير

05 28 84 38 38



05 28 84 29 77



www.agadir.ma



contact@agadir.ma



80 000 - المغرب.

